

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Versiòn

5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
6

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

4

002

-

2

No.Compromiso

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

73096526

Radicado: 2-2022-016322

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

ADELANTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBIÓ PARA EJECUTAR OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL SEGUNDO PISO, Y DEMÁS ÁREAS DE INFLUENCIA, DEL EDIFICIO SAN AGUSTÍN UBICADO EN LA CARRERA 8 NO. 6C 38 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., PROPIEDAD DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bogotá D.C., 20 de abril de 2022 11:14

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/07/2021

NOMBRE CONTRATISTA

RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

VR CONTRATO MAS ADICIONES

498,666,668.48

ADIC

18,666,666.74

COTR

480,000,001.74

FECHA DE INICIO:

23/07/2021

FECHA DE TERMINACION:

28/02/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

14,800,115

SALUD

1,850,000

PENSION

2,516,000

A.R.L.

77,300

VALOR PAGADO:

404,769,660.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

93,897,008.48

% EJECUCIÓN:

81

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 29/12/2021

Desde 01/01/2022 Hasta 28/02/2022

Tiempo Adicion 0 años - 1 meses y 28 días

Objeto: OTROSÍ 1 DEL CONTRATO 4.002-2021, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE LAS CLÁUSULAS SEGUNDA ¿PLAZO¿, CUARTA ¿VALOR¿ Y SEXTA ¿RESPALDO PRESUPUESTAL

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
ACTURACION NO.	FE-15	CONDICION DE PAGO	CORTE DE OBRA # 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	37,000,287.08	19 %	7,030,054.55		44,030,341.63
		TOTALES		37,000,287.08		7,030,054.55		

TOTAL A PAGAR

44,030,341.63

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ENERO DEL AÑO 2022

PLANILLA No.

9430913742, 9432385545

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

2

Otros Anexos o Folios

110

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

4

Total de Folios Anexos

117

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 4 dias del mes de Abril del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ
CARGO: SUBDIRECTOR
CEDULA: 79358551

FIRMA:
NOMBRE: ERIKA YUDITH ALVAREZ SEPULVEDA
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CEDULA: 37270349

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
		Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago		Versiòn	5

FIRMA: _____
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA ARDILA FALKONERTH
CARGO: ASESORA
CEDULA: 52696292



uDwe 5Wys NvyG bSKZ lj9q w632 sG0=
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por:NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ
Subdirector de Administraci?n de Recursos Tecnol?gicos

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 34

CONTENIDO DEL INFORME


1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	3

1. CONDICIONES DEL CONTRATO


Número de Contrato: 4 – 002 - 2021
 Nombre del Contratista: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO.
 Periodo informe: DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022
 Supervisor: ING. ERIKA ALVAREZ SEPULVEDA
 ARQ. MARIA ALEJANDRA ARDILA FALKONERTH
 ING. NOE HERNANDEZ RODRIGUEZ

Área perteneciente: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

2. **OBJETO DEL CONTRATO:** Adelantar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que se suscriba para ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demás áreas de influencia, del edificio San Agustín ubicado en la carrera 8 No 6C – 38 de la ciudad de Bogotá D.C., propiedad de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 34

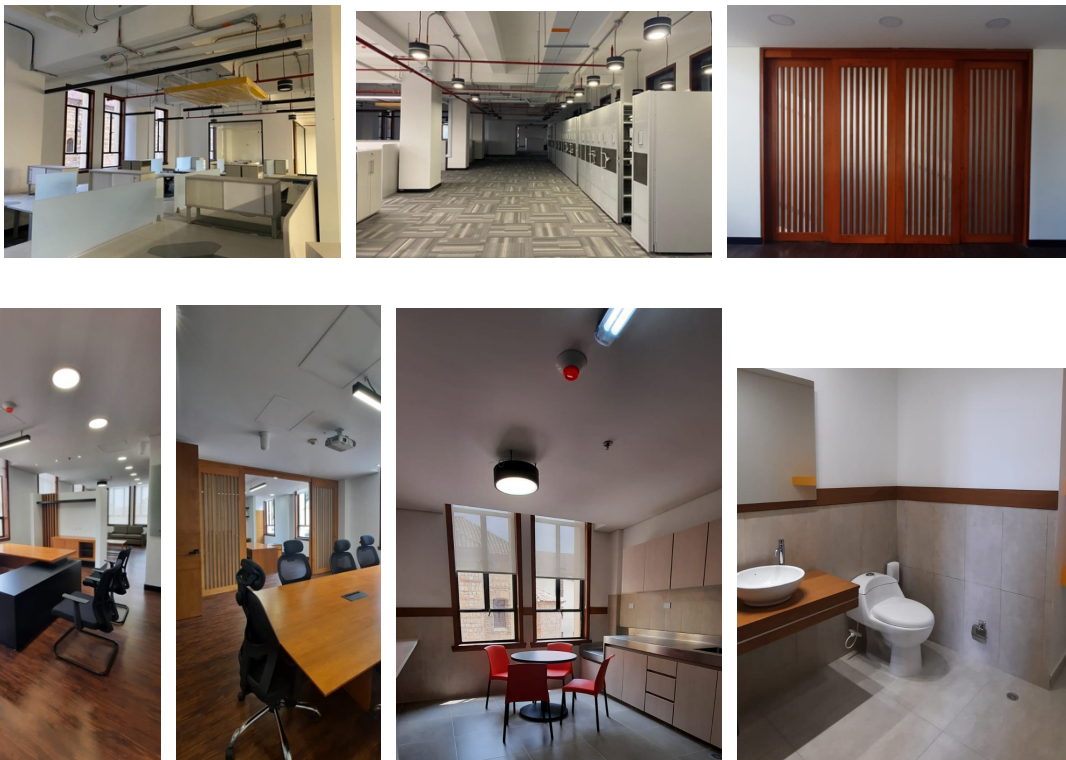

Imágenes del edificio San Agustín segundo piso - Ministerio de hacienda y Crédito Público

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y DEL PROYECTO

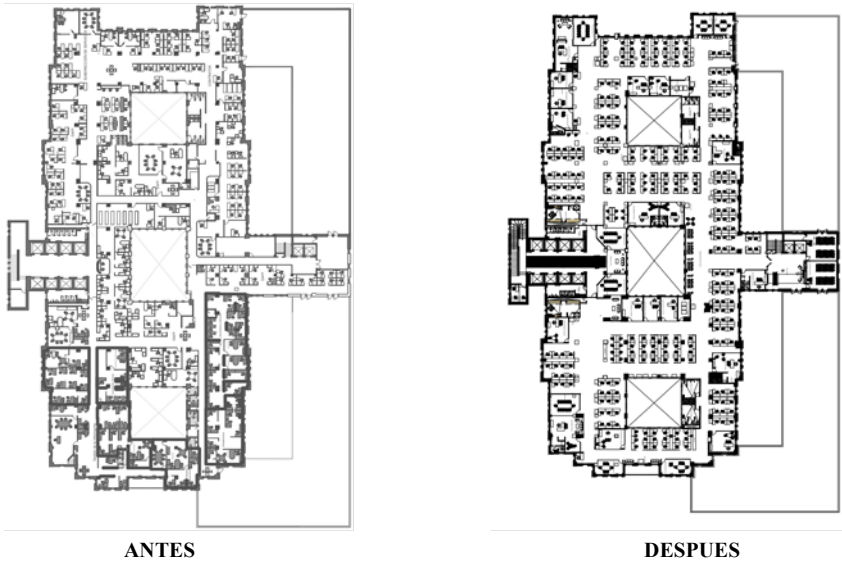


Imagen planta arquitectónica final segundo piso

El sitio a intervenir es un rectángulo conformado por tres zonas cada una con grades tragaluces que permite la entrada de iluminación, el traga luz central está dividido por un eje que divide el edificio en ala norte y ala sur. Actualmente se encuentra dos cafeterías, baños internos en algunas oficinas, baterías de baños de caballeros y damas, zona de aseo,

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 34

puestos de oficinas con divisiones modulares piso techo y a media altura, las cuales fueron desmontadas. El eje central transversalmente remata en dos puntos de evacuación y acceso del piso.

La intervención contempla preliminares, desmontes, demoliciones, pisos, pañetes, mampostería, enchapes, pintura, Drywall, divisiones de vidrios, carpintería metálica, carpintería madera, mobiliario de oficina, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, señalizaciones y aseo general.

En el trancurso de la obra se realizaron modificaciones al diseño entregado por la entidad, en pro del mejoramineto, calidad y funcionamineto de los espacios como: ofiicnas, puests de trabajos, circulacionse, bateria de baños entre otros. Teniendo en cuenta estas modificaciones , el contratista de obra se encuentra trabajando en los planos record, los cuales seran entregados entre listado de documentos para la liquidacion de dicho contrato.

PLANTA ARQUITECTONICA ACTUALIZADA



Imagen planta arquitectónica final

PERSONAL QUE LABORA EN LA INTERVENTORÍA.

La interventoría para el control y seguimiento al contrato de obra, mantiene en la obra el personal mínimo requerido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el cual relacionamos los siguientes:

Director de Interventoría	ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA
Residente de Interventoría	ARQ. ERIKA CARRASQUILLA FANG
Residente siso:	MARIBEL MARTINEZ GARZON
Profesional con experiencia en diseño de interiores o en diseño Arquitectónico	ARQ. CINDY MAJERLIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Ingeniero eléctrico	ING. JESUS ALBERTO LOPEZ BELANDIA

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 34

ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El alcance del presente contrato de obra No. 1-001-2021, ejecutar las obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demás áreas de influencia, del edificio San Agustín ubicado en la carrera 8ª No 6C 38 de la ciudad de Bogotá D.C., propiedad de la nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo la modalidad de precios unitarios fijos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha considerado realizar intervención al edificio en el segundo piso la cual incluye las siguientes actividades por capítulos contractuales:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CAPITULO
1	Preliminares	\$ 22.584.590.00
2	Desmontes	\$ 128.819.412.00
3	Demoliciones	\$ 50.067.785.00
4	Pisos	\$ 829.879.845.00
5	Pañetes	\$ 112.322.100.00
6	Mampostería	\$ 47.132.830.00
7	Enchape	\$ 37.960.083.00
8	Pintura	\$ 70.400.200.00
9	Drywall	\$ 125.690.060.00
10	Divisiones de vidrio	\$ 170.833.839.00
11	Carpintería metálica	\$ 99.929.000.00
12	Carpintería de madera	\$ 502.446.893.00
13	Mobiliario para oficinas	\$ 1.388.081.947.00
14	Instalaciones hidráulicas y sanitarias	\$ 65.681.177.00
15	Accesorios	\$ 66.972.345.00
16	Vidrios y espejos	\$ 87.814.882.00
17	Impermeabilización	\$ 3.561.700.00
18	Instalaciones eléctricas	\$ 403.302.956.00
19	Cableado estructurado	\$ 705.387.384.00
20	Señalización	\$ 10.428.301.00
21	Aseo general	\$ 39.195.200.00

VALOR COSTO DIRECTO	\$ 3.580.410.582
ADMINISTRACION 10.40%	\$ 372.362.701
IMPREVISTOS 4.40%	\$ 157.538.066
UTILIDAD 4.60%	\$ 164.698.887
IVA / UTILIDAD 19.00%	\$ 31.292.788
SUB TOTAL OBRA	\$ 4.306.303.023
MOBILIARIO PARA OFICINA SIN IVA	\$ 1.166.455.418
IVA MOBILIARIO 19.00%	\$ 221.626.529
ITOTAL MOBILIARIO PARA OFICINA CON IVA	\$ 1.388.081.947
TOTAL, PROYECTO ANTES DE IVA	\$ 5.441.465.653
TOTAL, IVA	\$ 252.919.318
COSTO TOTAL DE LA OBRA	\$ 5.694.384.971

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de obra No. 1-001-2021 que inicialmente incluía Veintiun (21) capítulos, este paso a Veintidos (22) capítulos, razones expuestas en las solicitudes realizadas por el contratista de obra y concepto favorable de parte de la interventoría a la supervisión MHCP. El capítulo No22 se llama: Items No previstos.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 34

1. Preliminares
2. Desmontes
3. Demoliciones
4. Pisos
5. Pañetes
6. Mampostería
7. Enchapes
8. Pintura
9. Drywall
10. Divisiones de Vidrio
11. Carpintería metálica
12. Carpintería en madera
13. Mobiliario para oficina
14. Instalaciones hidráulicas y sanitarias
15. Accesorios
16. Vidrios y espejos
17. Impermeabilización
18. Instalaciones eléctricas
19. Cableado estructurado
20. Señalización
21. Aseo general
22. Ítems No previstos

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Teniendo en cuenta los aspectos administrativos, técnicos y financiero de la obra, la interventoría realiza supervisión durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022:

1-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

- Disponer y administrar los recursos del personal, equipo, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la interventoría.
- Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio.
- Elaborar actas de acuerdo con la fecha específica en que se presente de la siguiente manera: Acta de inicio, acta de recibo parcial de obra, acta de recibo final de obra, actas de reuniones, actas de suspensiones (en caso de requerirse). Acta de reanudaciones (en caso de requerirse), acta de aprobación de los trabajos y recibos, acta de liquidación del contrato.
- Asegurarse y verificar que la entidad este amparada por las garantías contractuales establecidas. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso.
- Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo del contrato.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	6 de 34

- Facilitar al contratista en calidad de préstamo los planos, estudios, documentos e información general en poder del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Servir de conducto regular en las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el contratista y coordinar las relaciones de la interventoría y el contratista con las diversas dependencias del Ministerio y de terceras personas o entidades.
- Ejecutar las demás actividades que se detallen de carácter administrativo.

Avances:

-Se verifico que todo el personal técnico y administrativo sea idóneo para el desarrollo de todas las distintas actividades de obra. Se aprobaron las hojas de vidas del personal profesional contractual.

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA
RESIDENTE DE OBRA	JENNI ANGELICA SIERRA MAYORGA
EXPERTO HIDRAULICO	IVAN AUGUSTO CUBILLOS TRUJILLO
PROFESIONAL ELECTRICO	GABRIEL ANGEL IDARRAGA SIERRA
PROFESIONAL SISO	LEIDYS BUITRAGO CRUZ
PROFESIONAL CALIDAD	ORLANDO AUGUSTO PULIDO
PROFESIONAL CUYO NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO SEA DE INGENIERIA DE SISTEMA, TELEMtica Y AFINES, Y/O INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES O AFINES Y/O INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES Y/O INGENIERIA MECANICA Y AFINES.	GUILLERMO ALBERTO MARTINEZ BASTIDA

Del personal profesional inicialmente aprobado, han sido cambiados en el periodo los siguientes profesionales:

Residente HSEQ: el cambio de Adriana Sáenz Ballesteros por José Alexander Esmeral Vargas fue aprobado mediante oficio MH-08 -2021 de 04 de agosto de 2021

Residente HSEQ: el cambio de José Alexander Esmeral Vargas por Leidys Buitrago Cruz aprobado mediante oficio MH -17-2021 del 10 de agosto de 2021.

Residente de Obra: el cambio de Marina Ruiz Hernández por Néstor Javier Forero Granada fue aprobado MH – 06-2021 del 31 de julio 2021

Residente Eléctrico: el cambio de Gustavo Arboleda por Daniel Alberto Urbina Jiménez fue aprobado mediante oficio MH-18-2021 del 10 de agosto de 2021.

Residente Eléctrico: el cambio de Daniel Alberto Urbina Jiménez por Gabriel Idárraga fue aprobado mediante oficio MH-23-2021 del 23 de agosto de 2021.

Residente de Obra: el cambio de Néstor Javier Forero Granada por Yeni Angelica Sierra Mayorca fue aprobado mediante oficio MH –57 -2021 del 09 de diciembre 2021

- Se consigno en el libro de obra (bitácora) todos los temas tratados, compromisos adquiridos entre las partes intervinientes

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 34

-Se verifico que las garantías – pólizas que ampare los riesgos contractuales establecidos por la entidad Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

I. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

a. Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, Por un monto no inferior a 500 SMLMV, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y una vigencia igual periodo de ejecución del contrato.

Para la cobertura de predios laborales y operacionales y demás establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015 que son:

a) Daño emergente y lucro cesante.

b) Perjuicios extrapatrimoniales.

c) Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas.

d) Amparo patronal.

e) Gastos médicos inmediatos.

f) Vehículos propios y no propios.

NOTA: La garantía deberá constituirse respecto de los asegurados y beneficiarios en los términos del numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.3.2.9, Decreto 1082 de 2015.

DEDUCIBLE: 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA – SIN INCLUIR MÍNIMOS.
(La vigencia de los amparos de Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes y calidad del servicio se estipula de conformidad con la garantía adicional ofrecida por el CONTRATISTA).

PARAGRAFO PRIMERO- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA. – El contratista deberá constituir la garantía De acuerdo con el perfeccionamiento del contrato de obra No. MHCP- LP – 01- 2021 y lo estipulado en la cláusula octava; el contratista Unión temporal NM - PROHACER libró a favor del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**, la póliza de seguro de cumplimiento para entidad estatal **No. AA218420** y la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. AA218421**, expedidas por la compañía de seguros **EQUIDAD SEGUROS** y aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito público, con los siguientes amparos.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO			
AMPAROS	VIGENCIAS		ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	2021-07-14	2022-06-15	\$ 1.138.876.994.20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2021-07-14	2022-06-15	\$ 1.138.876.994.20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2021-07-14	2026-12-15	\$ 1.138.876.994.20
Calidad del servicio:	2021-07-14	2024-12-15	\$ 1.138.876.994.20
Pagos de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:	2021-07-14	2024-12-15	\$ 284.719.248.55

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 34

Estabilidad y calidad de la obra	2021-12-15	2026-12-15	\$ 1.138.876.994.20
----------------------------------	------------	------------	---------------------

Cuadro 1 Información General del Contrato de Obra

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	\$ 454.263.000.00
Contratista y subcontratista	\$ 454.263.000.00
Responsabilidad civil patronal	\$ 454.263.000.00
Vehículos propios y no propios	\$ 454.263.000.00

Polizas actualizadas según OTROSI No3 al contrato de obra No 1.001-2021 con fecha de expedición 28-01-2022 :

GARANTIAS OTORGADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	2022- 01 - 22	2022 - 07-31	\$ 1.190.579.339.20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	2022- 01 - 22	2022 - 07-31	\$ 1.190.579.339.20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2022- 01 - 27	2027 - 01-27	\$ 1.190.579.339.20
Calidad del servicio:	2022- 01 - 22	2025 - 01- 31	\$ 1.190.579.339.20
Pagos de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:	2027 – 01- 27	2025 - 01-31	\$ 297.644.834.80
Estabilidad y calidad de la obra	2022 – 01 -31	2027 - 01-31	\$ 1.190.579.339.20

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL


AMPAROS	DEDUCIBLE	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	10%	\$ 500.000.000.00
Contratista y subcontratista	10%	\$ 500.000.000.00
Responsabilidad civil patronal	10%	\$ 500.000.000.00
Vehículos propios y no propios	10%	\$ 500.000.000.00

- Se realizaron las actas de comité de seguimiento de obra realizada en el piso 8 del Ministerio de hacienda y Crédito Público.

Comité de seguimiento realizado en este periodo:

No	Acta de comité
23	05 de enero de 2022
24	12 de enero de 2022
25	19 de enero de 2021
26	26 de enero de 2021

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	9 de 34



Imágenes comité de seguimientos Piso 8 y recorridos por la obra piso 2-

En cuanto al área de seguridad y salud en el trabajo se verifico que el contratista:

Periodo correspondiente del 01 de enero 2022 al 31 de enero de 2022.

- Se continua con el retiro de escombros, chatarra y entrega de respectivos certificados.
- Se entrega carnet de vacunación COVID 19 al Ministerio de hacienda y crédito publico verificando que el personal de obra e interventoria esten al dia con esquema de vacunacion.
Diariamente se envia formatos de condiciones de salu por parte del contratista e interventoria.
- Se hace seguimiento diariamente a los trabajos de alto riesgos con sus debidos permisos.
- Se verifica el buen uso de los EPP.
- Se realiza supervisión al personal de obra tanto operativo como administrativo del carnet de vacunación contra el Covid 9 con esquema completo según lo descrito en el decreto 1408 del 03 de noviembre de 2021.
- Teniendo en cuenta el aumento en los contagio de covid 19 a nivel nacional, el contratista de obra y la interventoria entregan a supervisión la relación del personal que ha sido contagiado por este virus, para llevar la respectiva supervsion del aislamiento establecido que deben tener las personas contagiadas.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	10 de 34




Imágenes solicitud de carnet de vacunación Covid 19 al personal de obra


En cuanto a la parte eléctrica:

Periodo correspondiente del 01 de enero 2022 al 31 de enero de 2022

- Teniendo en cuenta el VoBo de la interventoría y aprobación por la supervisión del diseño eléctrico y de iluminación, se realizaron la instalación de puntos eléctricos, ubicación de bandejas, acometidas eléctricas e instalación de luminarias como lo indica el diseño aprobado



Imágenes diseño de iluminación para el piso 2



Imágenes iluminación piso 2

2-ASPECTOS TÉCNICOS:

- Se supervisa que se cumpla estrictamente el contrato de obra y especificaciones técnicas de materiales y ejecución de las actividades contractuales.
- Revisión y verificación de los planos y documentación suministrados por la entidad Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Revisar, aprobar y complementar junto al contratista, el cronograma de ejecución de obra.
- Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto, durante la ejecución del contrato, de acuerdo a la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo del mismo.
- Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo a los pliegos de condiciones

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	11 de 34

MHCO-LP-01-2021 y a la propuesta técnica y económica. Metodología y especificaciones pactadas en el contrato de obra.

- Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el cronograma y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, así como detectar los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos correspondan.
- Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y de oficina, análisis y complementación de información sistematización, simulación, diseños y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes.
- Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficientes, ordenando su correspondiente corrección.
- Consignar en las respectivas actas, todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Presentar mensualmente los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos. Problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, y actividades de la interventora, que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos.
- El interventor deberá entregar a su supervisor los requerimientos efectuados al contratista de obra, así como los informes presentados por la interventora la entidad para la respectiva publicación al SECOP II.
- Ejecutar las demás actividades de carácter técnico que se detallen en el contrato.
- Evaluar y presentar con sus correspondientes justificaciones ante el supervisor del contrato de interventoría cualquier cambio sustancial en el desarrollo del mismo, en su alcance y en todas las actividades que afecten el desarrollo.
- Controlar permanentemente la calidad de los trabajos en ejecución.
- Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta crítica con la supervisión de la subdirección de servicios.

Avances:

Periodo correspondiente del 01 de enero 2022 al 31 de enero de 2022

En el transcurso de ejecución de la obra se sigue actualizando los planos arquitectónicos incluyendo el mobiliario.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	12 de 34

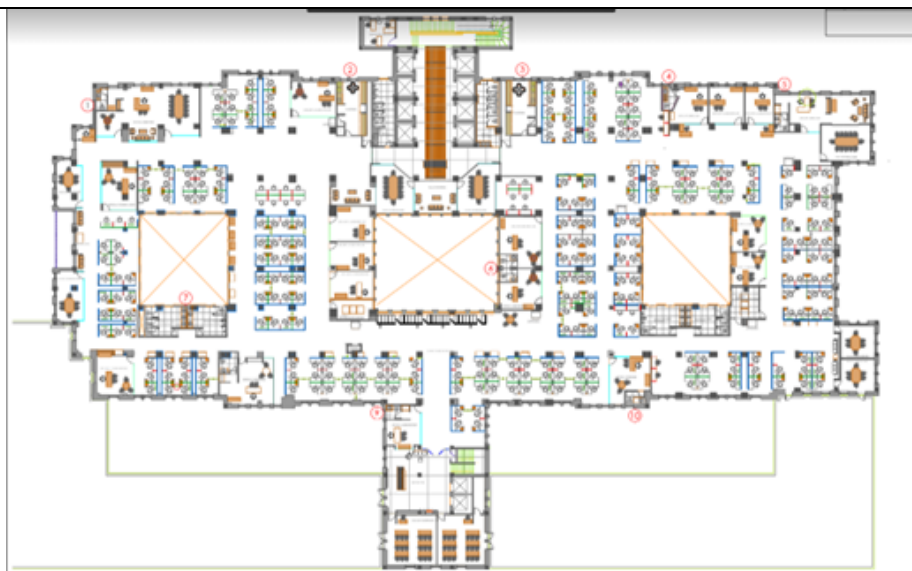


Imagen planta arquitectonica de mobiliario final

- Se presento muestra para la cortinas del segundo piso por parte del contratista, la cual se le dio VoBo de la interventoria y aprobacion por parte de la supervision del MHCP. Antes de ser presentada se verifico que la muestra presentada cumpliera con las especificaciones contractuales.




Imagen muestra de cortina aprobada por la supervisión MHCP


En cuanto al área de seguridad y salud en el trabajo se verifico que el contratista:

Periodo correspondiente del 01 de enero 2022 al 31 de enero de 2022

Se realizaron calestenias, pausas activas y charlas para el personal tanto operativo como administrativo.

Se solicitaron ATS (Análisis de Trabajo Seguro) para sus respectivas correcciones.

Se verifico en la pagina de Ministerio de trabajo los cursos de altura de los trabajadores del contratista encontrándose avalados.



	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	13 de 34




Imágenes de calestenias y charlas al personal de obra

En cuanto al capítulo eléctrico se verifico que el contratista:

Periodo correspondiente del 01 de enero 2022 al 31 de enero de 2022

- Se continuo con la instalación de luminarias.
- Se continuo con la instalación de tuberías para tomacorrientes normales y regulados y ducterías para las salidas de voz y datos.
- Se realizo todo el traslado de la parte eléctrica del tercer piso,
- Se continuo con la instalación de bandejas del segundo piso e instalación de ducterías para las salidas de toma corrientes en oficinas.
- Se realizó el pesaje de material desmontado (bandejas).
- Se realizó prueba de iluminación en todo el segundo piso.
- Se realizó certificación de RETIE y RETILAP.

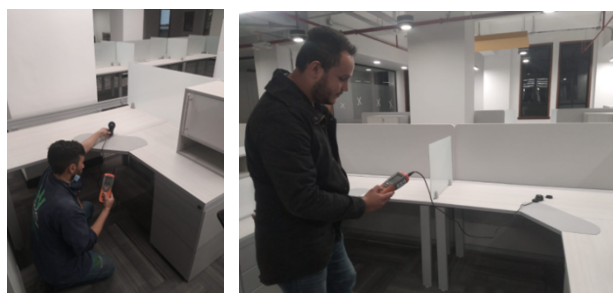

Imágenes de certificaciones Retilap

La certificación retilap la realiza la empresa ODIR certificaciones, la cual está a cargo de los ingenieros Jhon Cabrera y Jairo Rodríguez, debido a la extensión del proyecto. Los ingenieros se encargan de tomar las mediciones correspondientes a los niveles de iluminación de acuerdo al diseño y verificando el cumplimiento de lo establecido en el reglamento. Visita realizada en horas de la noche con el fin de validar los parámetros requeridos para el cumplimiento de los estándares requeridos en luminotecnia.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	14 de 34



Imágenes de certificaciones Retie

La certificación Retie la realiza la empresa ODIR certificaciones, el inspector encargado del proceso es Javier Cortés, quién hace la revisión completa a las instalaciones eléctricas con el fin de expedir el documento con el dictamen favorable, La visita de Certificación se realizó el pasado 28 de Enero de 2022.

En cuanto al capítulo mobiliario se verifico que el contratista:



Imágenes reunión contratista , interventoria y proveedor de mobiliario detalles finales.

- Se reciben y verifican la llegada del mobiliario a la obra de los siguientes elementos: Sillas para cafetería, puestos de trabajo completos, escritorios para oficinas directores, archivadores rodantes, archivadores en madera para oficina de directores, mesas de juntas, mesas redondas para oficinas, sofás para salas de esperas, mesas de centro para salas de esperas , sofás de dos puestos, sofás de tres puestos, entre otros.
- Se realizo reunión y recorrido en la obra para detalles pendientes referente a los puestos de trabajo, suplementos de superficie, entre otros que son importante para terminar dicha instalación.

3- ASPECTOS FINANCIEROS:

- Velar, durante la ejecución del contrato, porque se mantengan las condiciones económicas, y financieras señaladas en la oferta del contrato de obra respecto de los valores unitarios facturados.
- Revisar y aprobar la certificación de cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
- Revisar y aprobar las solicitudes de pagos formuladas por el contratista de obra y llevar un registro de los pagos realizados.
- Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignados de acuerdo a los valores del contrato.
- Efectuar la revisión del balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo.
- Programar pagos del contratista, previa verificación de los requisitos y soportes para la programación del PAC.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	15 de 34

- Verificar y controlar en todo momento la ejecución y uso de los recursos entregados como anticipo al Contratista de obra.
- Aprobar el plan de inversión del anticipo del contrato de obra.
- Presentar un informe mensual final detallado con la ejecución y rendimientos generados con los recursos correspondientes al anticipo del contrato de obra y la devolución de dichos rendimientos al tesoro nacional.

Avance:

- Se reviso y verifíco el cumplimiento de las planillas de seguridad Social del personal operativo y administrativo, como también los parafiscales.
- se recibió por parte del contratista el acta de corte parcial No 6, el cual fue revisado por la interventoría para su Vo.Bo y aprobación por parte de la supervisión del contrato.
- Se realizo entrega del sexto informe de ejecución del mes de enero 2022 a la supervisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el DNP.

Durante la ejecución del contrato se han identificado menores y mayores cantidades de obra, así como la necesidad de ejecutar ítems no previstos, con el fin de garantizar la satisfacción de la necesidad del Ministerio y el cumplimiento de las normas que rigen la ejecución del proyecto de obra en el segundo piso del edificio San Agustín, teniendo en cuenta esto, se suscribió el 7 de diciembre de 2021 el otrosí No 1 al contrato No 1.001-2021 mediante el cual se prórroga el plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2021, se adiciona el valor del mismo hasta por la suma de \$ 185.300.420,00 moneda corriente, y se modifican parcialmente las cláusulas Sexta “RESPALDO PRESUPUESTAL” y séptima “OBLIGACIONES ESPECIFICAS”. Este valor adicionado incluye IVA y todos los demás impuestos, tasas y contribuciones, y AUI, se pagar al contratista en la forma prevista en la cláusula quinta del contrato de obra.

La interventoría Rafael Eduardo Zamora Melo remitió solicitud de modificación del contrato de obra No 1.001-2021, por medio del cual requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2022, por lo cual se modifica la cláusula sexta “Respaldo Presupuestal”, de conformidad a la razones expuestas en dicha solicitud, por lo cual se suscribe otrosí No2 al contrato de obra No1.001-2021, prorrogándose el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2022 y modificando parcialmente la cláusula sexta “Respaldo Presupuestal”.

ITEM	VALOR
VALOR CONTRATO (A)	\$5.694.384.971
BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	-\$524.991.984
SUBTOTAL	\$5.169.397.987
VALOR ÍTEMES NO PREVISTOS	\$101.519.896
VALOR ÍTEMES MODIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$608.772.508
TOTAL (B)	\$5.879.685.391
VALOR ADICIÓN (A – B)	\$185.300.420

Los valores del contrato fueron redondeados y ajustados al peso de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de la cláusula 5 “formas de pagos” del presente contrato.

Clausula Tercera – Disponibilidad presupuestal: Se modifica parcialmente la cláusula sexta Respaldo presupuestal”, la cual quedo de la siguiente manera:

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
			Fecha:	22-03-2019
			Versión:	3
			Página:	16 de 34

El valor total del contrato de obra **No. 1-001- 2021** y para todos los efectos legales es de **\$ 5.952.896.696.00, incluido la adición - otrosi No1, otrosi No 2, otrosi N 3** y el **Ministerio de hacienda y Crédito Público** tiene como respaldo financiero el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

VIGENCIA	FUENTE DE LOS RECURSOS	RESPALDO PRESUPUESTAL	V/R RESPALDO	V/R MÁXIMO A AFECTAR
2021	PGN	CDP 45921 del 25/01/2021 y	5.974.674.947,00	Hasta \$5.879.685.391,00
		adicionado el 10/11/2021		
VALOR TOTAL PRESUPUESTO				\$5.879.685.391,00

Otrosí No 1

VIGENCIA	FUENTE DE LOS RECURSOS	RESPALDO PRESUPUESTAL	V/R RESPALDO	V/R MÁXIMO A AFECTAR
2021	PGN	CDP 45921 del 25/01/2021, adicionado el 10/11/2021	\$5.974.674.947,00	Hasta \$5.453.830.096,00
*2022	PGN	Oficio aprobación vigencias futuras No. 2-2021-067601 del 21 de diciembre de 2021	\$560.658.963,00	Hasta \$425.855.295,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO				\$5.879.685.391,00

Otrosí No 2

Una vez realizado el balance e mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos y modificaciones de especificaciones, se obtiene que el valor necesario para la adición asciende a la suma de 73.211.305.00

Moneda corriente incluido IVA. AIU y todos los costos y gastos directos e indirectos, valor avalado por la interventoría según consta en el respectivo análisis de precios las cuales hacen parte de la solicitud realizada, la cual se encuentra amparada presupuestalmente en la adición al CDP 39522 del 14 de enero de 2022.

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, se suscribe Otrosi No 3 al contrato de obra **No. 1-001- 2021** mediante el cual se adiciona el valor del mismo hasta por la suma de \$73.211.305.00 moneda corriente, y se modifica parcialmente las cláusulas sexta "RESPALDO PRESUPUESTAL" y séptima "OBLIGACIONES ESPECIFICAS".

VIGENCIA	FUENTE DE LOS RECURSOS	RESPALDO PRESUPUESTAL	V/R RESPALDO	V/R MÁXIMO A AFECTAR
2021	PGN	CDP 45921 del 25/01/2021, adicionado el 10/11/2021	\$5.974.674.947,00	Hasta \$5.453.830.096,00
2022	PGN	CDP No. 39522 del 14 de enero de 2022, adicionado el 21 de enero de 2022	\$499.066.600,00	Hasta \$499.066.600,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO				\$5.952.896.696,00

Otrosí No 3

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	18 de 34

\$ 287.924.593	\$ 3.805.667.939
\$ 29.944.158	\$ 395.789.466
\$ 12.668.682	\$ 167.449.389
\$ 13.244.531	\$ 175.060.725
\$ 2.516.461	\$ 33.261.538
\$ 346.298.425	\$ 4.577.229.057
\$ 128.376.617,00	\$ 1.156.023.225
\$ 24.391.557	\$ 219.644.413
\$ 152.768.174	\$ 1.375.667.638
\$ 472.158.582	\$ 5.699.990.744
\$ 26.908.018	\$ 252.905.951
\$ 499.066.600	\$ 5.952.896.696
\$ 30.435.622	\$ 1.138.876.994
\$ 468.630.978	\$ 4.814.019.701

Corte parcial de obra No 6

ANTICIPO

El contratista al presentar la documentación descrita en el contrato para el anticipo el cual es equivalente al 20% del valor total del contrato por valor de **\$1.138.876.994,20**, descrito en contrato de obra 1- 001- 2021, este fue consignado a la fiducia el día 27 de septiembre de 2021.

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	MATERIALES	\$ 217.525.505,89	19,10%
1.1	Pisos	\$ 217.525.505,89	19,10%
2	CONTRATO ESPECIALIZADOS	\$ 921.351.488,31	80,90%
2.1	Pañetes	\$ 68.332.619,65	6,00%
2.2	Mampostería	\$ 45.555.079,77	4,00%
2.3	Desmontes y demoliciones	\$ 56.943.849,71	5,00%
2.4	Carpintería Madera	\$ 67.193.742,66	5,90%
2.5	Mobiliario para Oficina	\$ 284.719.248,55	25,00%
2.6	Instalaciones eléctricas y cableado estructurado	\$ 284.719.248,55	25,00%
2.7	Instalaciones hidráulicas, sanitarias y accesorios	\$ 46.693.956,762	4,10%
2.8	Carpintería Metálica	\$ 67.193.742,658	5,90%
TOTAL		\$ 1.138.876.994,20	100,00%

Plan de inversión y manejo del anticipo actualizado

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	19 de 34

ITEM	ANTICIPO	CORTE 1	CORTE 2	CORTE 3	CORTE 4	CORTE 5	CORTE 6	SALDO
EJECUTAR OBRAS CIVILES DE REMODELACIÓN	\$ 238.025.292	\$ 231.981.120	\$ 52.738.129	\$ -				-\$ 46.693.957
EJECUTAR INST. HIDROSANITARIAS FASE ADECUACIONES	\$ 46.693.957			\$ 25.655.557	\$ 39.702.041	\$ 56.717.889		-\$ 75.381.530
EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACABADOS DE OBRA EN LA FASE DE ADECUACIONES	\$ 217.525.506		\$ 160.308.910	\$ 67.466.489	\$ 629.881.276	\$ 1.354.511.848	\$ 32.299.589	-\$ 1.994.643.018
INSTALAR MOBILIARIO DE OFICINA ABIERTA Y PUESTOS DE TRABAJO	\$ 351.912.991			\$ 182.330.270	\$ 129.132.395	\$ 1.071.511.802	\$ 154.764.042	-\$ 1.031.061.476
INSTALAR REDES ELECTRICAS Y DE CABLEADO	\$ 284.719.249	\$ 92.456.754	\$ 62.833.014	\$ 44.870.131	\$ 153.849.525	\$ 1.097.882.940	\$ 312.002.969	-\$ 1.167.173.116
SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE GERENCIA Y OBRA A REALIZAR EN LA SEDE	\$ -	\$ 24.624.000	\$ 20.496.000	\$ 24.288.000	\$ 72.273.660	\$ 263.088.000		-\$ 404.769.660
TOTAL	\$ 1.138.876.994	\$ 324.437.874	\$ 275.880.053	\$ 320.322.447	\$ 952.565.238	\$ 3.580.624.480	\$ 499.066.600	-\$ 4.314.953.097
VALOR DIRECTO SIN DESCUENTOS	\$ 3.012.082.605							
AMORTIZACION 20%		\$ 64.887.575	\$ 55.176.011	\$ 64.064.489	\$ 190.513.048	\$ 716.124.896	\$ 48.110.976	\$ 0
DESCUENTOS		\$ 30.435.621	\$ -	\$ -	\$ -			
VALOR TOTAL PAGADO (Anticipo y cortes de obra)	\$ 1.138.876.994	\$ 229.114.678	\$ 220.704.042	\$ 256.257.958	\$ 762.052.190	\$ 2.864.499.584	\$ 450.955.624	\$ 5.922.461.071
VALOR TOTAL CONSIGNADO POR MHCP A UT-NM PROHACER (Contratista)								\$ 2.607.005.863
VALOR TOTAL CONSIGNADO POR MHCP A RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO (Interventoria)								-\$ 404.769.660

Cuadro de relación de gastos de manejo del anticipo y actas parciales pagadas. Corte No 1, corte No 2, corte No 3 y corte No 4, corte No 5 y corte No 6 de obra

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

El valor que se entregue al contratista de obra como anticipo será amortizado en los pagos mensuales a realizar por las obras ejecutadas y aprobadas por el interventor, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo, en todo caso, el porcentaje pendiente por amortizar deberá descontarse en el último pago.

ACTAS PARCIALES	AMORTIZACION	VALOR AMORTIZADO HASTA LA FECHA
ANTICIPO	\$1.138.876.994,20,	
ACTA 1- VALOR AMORTIZADO.	\$ 64.887.575,00	
ACTA 2- VALOR AMORTIZADO	\$ 55.176.011,00	
ACTA 3- VALOR AMORTIZADO	\$ 64.064.489,00	
ACTA 4- VALOR AMORTIZADO	\$ 191.115.250,00	
ACTA 5- VALOR AMORTIZADO	\$ 716.124.896,00	
ACTA 6- VALOR AMORTIZADO	\$ 29.833.419,00	
		\$ 1.138.876.994

Hasta el acta parcial No 6 se realiza ultima amortizacion del anticipo consiganado al contratista de obra.

ITEMS ACTA PARCIAL No6

Actividades ejecutadas en el periodo del 1 al 31 de enero 2022:

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades las cuales son presentadas en el acta parcial No6 con sus respectivas memorias de cantidades, las cuales están siendo revisadas por la interventoria para VoBo de la interventoria y posteriormente para aprobación de la supervisión.

- Suministro, instalación, desmonte y retiro cerramiento provisional piso-techo en lámina de triplex e= 4mm pintada en color blanco incluye estructura de soporte y puertas

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	20 de 34

- Alistado de piso en mortero 1:3
- Suministro e instalación de pirlán metálico
- Suministro e instalación de guardaescoba en quintuplex de 10cm con acabado en color negro sellado y laca catalizada.
- Suministro e instalación rejilla 3"x2" con sosco cromada mate o aluminio.
- Vinilo sobre muro tres (3) manos, incluye resanes con estuco plástico
- Suministro e instalación de cielo raso en drywall
- Suministro e instalación de muro en dry wall e=0,12 acabado con tres manos de pintura acrílica a dos caras (Refuerzo en omega cada 0.60 m y en algunos casos repisa en madera vertical y horizontal para anclaje de elementos decorativos finales o cuadros)
- Suministro e instalación de cielo raso resistente al agua para baños y cafeterías (incluye tapas inspeccionables).
- Suministro e instalación de división de oficina en aluminio color negro de 1 ½ x 1 ½ con vidrio con 8mm templado incoloro
- Suministro e instalación de puerta cold rolled cal.18 con sus respectivos marcos (para zona de rack y verticales). Incluye cerradura, manija, bisagras, anticorrosivo y pintura en polvo al horno.
- Suministro e instalación división para orinal en acero inoxidable 304 cal. 20.
- Reemplazo de marcos en madera vanos ventanas incluye alfajía, dintel y costados laterales, remoción esmalte y pintura acabado natural 2,45 m x 1,00 m
- Restauración de marcos en madera vanos ventanas incluye alfajía, dintel y costados laterales, remoción esmalte y pintura acabado natural 2,45 m x 1,00 m
- Restauración de marcos en madera vanos ventanas incluye alfajía, dintel y costados laterales, remoción esmalte y pintura acabado natural 2,15mx1,30m
- Restauración de marcos en madera vanos ventanas incluye alfajía, dintel y costados laterales, remoción esmalte y pintura acabado natural 2,45 m x 1,50 m
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MDF PARA BAÑOS PRIVADOS. 1.0 M X 2.6. Suministro e instalación de puerta conformada en lámina de MDF, de 36mm, forrada en chapilla de madera, 2 dilataciones distanciadas 20 cm a la altura de la cerradura para demarcar sentido contrario de la beta de la chapilla, incluye bisagras y cerradura color negro (Incluye marco).
- Pérgola en listones en madera y estructura metálica
- Suministro e instalación mueble inferior en madera; incluye mesón y salpicadero en acero inoxidable
- Suministro e instalación muebles superior en madera
- Suministro e instalación de mesón de apoyo para cafetería en tablex y enchapado en fórmica.
- Mesón en granito negro San Gabriel de 0,60 m de ancho (incluye salpicadero de 10 cm en el mismo granito)
- Suministro e Instalación cenefa perimetral madera h=12cm espesor 25mm
- Suministro e instalación puesto de trabajo de 1,50m x 1,50 m secretarial, superficie en aglomerado enchapado con fórmica, recibidor en vidrio y faldero. Con archivadores 2x1, rieles esferados para gavetas, herrajes, parales, bases. troquelado para la instalación de puntos eléctricos y voz/datos. El puesto de trabajo debe tener 4 troqueles (uno para toma lógica, tres para tomas eléctricas). incluye gabinete superior sobrepuesto de 450mm x 300mm x 250mm
- Archivador Rodante de 6 cuerpos con mecanismo de rodamiento con cadena y poleas
- Suministro e Instalación mueble de recepción de 2.90m x 1.07m con recibidor según diseño. Troquelado para la instalación

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	21 de 34

de puntos eléctricos y voz/datos. Debe tener 5 troqueles (uno para toma lógica, cuatro para tomas eléctricas).

- Mueble inferior TV fabricado en triplex de 7mm de tres cuerpos, acabado en chapilla, con dilatación de 2mm en platina cromada perimetral incrustada horizontalmente, empates acolillados, mueble flotado colgado al muro.
- Suministro e instalación de cortinas enrollables solar screen al 3% (Medidas aproximadas 2. 5 m x 1. 3)
- Logo de 38 letras más barra en bronce (Ver Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas)
- Letras de la A hasta la H en bronce para hall de ascensores (Ver Anexo No.2 de Especificaciones Técnicas))
- Red suministro A.P. PVCP 1 1/4" Incluye anclaje tipo pera
- Suministro e instalación de espejo en cristal dilatado del muro mediante perfiles en aluminio 5 mm
- Suministro e instalación Tableros en vidrio templado de 0,08 mm con 4 dilatadores incluye película frost medidas 1,20 x 1,50 m
- Suministro e instalación de película frosted para divisiones de oficina (según diseño)
- Lavado de fachada con producto rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar fachadas deterioradas. Hall de ascensores
- Suministro aplicación de producto a base de agua para protección de piedra muñeca. Hall de ascensores piso 2
- Cable eléctrico AWG No.12
- Salida interruptor doble de balancín silencioso
- Suministro e instalación Tomacorriente eléctrica con polo a Tierra normal 110V
- Suministro e instalación de luminaria cilíndrica tipo LED de 700 lm
- Cables de datos: Par telefónico, multipar telefónico, UTP, coaxial, fibra óptica, VGA, entre otros
- Cable eléctrico en general totalizadores, breakers, tomas eléctricas
- Canaletas, cajas y tableros eléctricos, corazas
- Reubicación de punto lógico:
- Puntos de red sencillos puesto de trabajo
- Diseño y planos cableado estructurado
- Tomas dobles reguladas en puestos de trabajo
- Tomas dobles no reguladas en puestos de trabajo
- Producción suministro e instalación de sistema de señalización para dependencia y tráfico interior.
- Aseo general de obra
- Suministro e instalación de toma GFCI
- Certificación RETILAP
- Suministro e instalación de alimentador en calibre 3x4+1x4+1x6 Cobre (TN07 y TR07)
- Suministro e instalación de alimentador en calibre 3x2+1x2+1x4 Cobre (TR03)
- Suministro e instalación de alimentador en calibre 3x1/0+1x1/0+1x2 Cobre (TR04 y TR05)
- Suministro e instalación de punto de datos piso 3 AMP
- isla de 2 puestos, 1.5 m x 1,50m aproximado cada puesto, superficie en aglomerado enchapado con fórmica, repisa, archivadores 2x1, rieles esferados para gavetas, herrajes, gabinete, parales, bases, montante de 45 cm entre cada puesto para independencia en vidrio opalizado laminado entre 6 y 8 mm, anclajes de acero a superficie, pasacables. troquelado para la instalación de puntos eléctricos y voz/datos.cada puesto de trabajo debe tener 4 troqueles (uno para toma lógica, tres para tomas eléctricas). incluye gabinete superior sobrepuesto de 450mm x 300mm x 300mm

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	22 de 34

- Isla de 6 puestos, cada puesto de 1,50 m x 1,50 m aproximado, superficie en aglomerado enchapado con fórmica, portateclado metálico diagonal a 45° desmontable, archivadores 2x1, rieles esferados para gavetas, herrajes, gabinete, parales, bases, montante de 45cm entre cada puesto para independencia en vidrio opalizado laminado 6mm, anclajes de acero a superficie, pasacables. troquelado para la instalación de puntos eléctricos y voz/datos. cada puesto de trabajo
- Silla interlocutora en microfibra para oficina cerrada, base negra.
- Suministro e instalación de Locker's con estructura en ángulo metálico y cajas en MDF con acabado en chapilla. (1,20X0,35X0,30)
- Impermeabilización terraza (40 m2) incluye alistado y reposición de piso
- Camara de inspeccion en cieloraso de 60 x 60 incluye apertura de hueco, marco en aluminio y tapa en drywall
- Suministro e instalación grifería anti vandálica pico largo, accionamiento mecánico ,cierre automático ,sin tornillos a la vista, alta presión 8 a 40 m.c.a acabado metálico cromado longitud exterior del pico 15 cms aprox, 1/2"

Productos del contrato

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2022, se realizaron las siguientes actividades de avance y ejecución de obra.





Mueble cafeteria: Se realizo la instalacion del meson en acero inoxidable en el mueble inferior de la cafeteria del segundo piso



Vidrios puertas metalicas: Se realizo el suministro e instalacion de vidrios esmerilados en las pertas metalicas que dan hacia las terrazas del segundo piso.


	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	23 de 34



Cortinas: Se realizó la instalación de cortinas para ventanas con las especificaciones exigidas y la muestra aprobada por la supervisión de la entidad.






Tapa luces ventanas: Se realizó la instalación de tapaluces en madera de las ventanas del segundo piso.


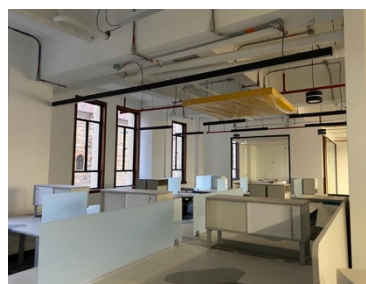


Plafones: Se realizó la instalación de plafones en madera ubicados en la zona de los puestos de oficinas tal cual como lo indican las especificaciones y el color de referencia.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	24 de 34

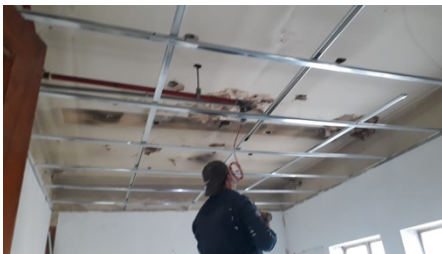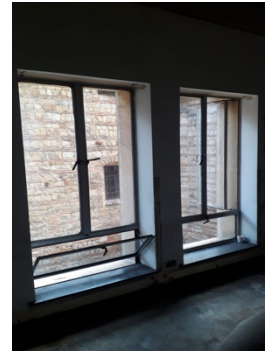

Acondicionamiento cuarto de seguridad : Se realizo el desmonte de alfombra, cieloraso, cortinas, puestos de trabajo asi como también la instalacion de cielo raso en drywall, aplicación de mastico, instalaciones eléctricas nuevas, pintura, instalación de alfombra según especificaciones.

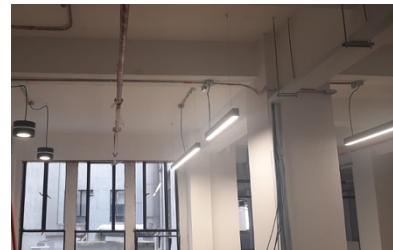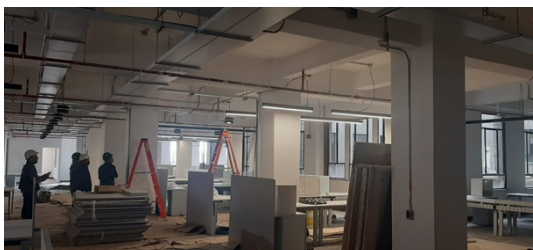

Luminarias: Se realizo prueba de las luminarias instaladas en el segundo piso.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	25 de 34




Pirlan en granito: Se realizo la aplicación del granito pulido entre el piso de mármol y acceso ascensores e la zona de recepción de la carrera 8.



 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	26 de 34



Instalaciones electricas: Se realizo la instalacion de cableados UTP ,continuacion de instalacion de bandejas y tableros electricos, salidas de luminarias, tomas corrientes e interruptores, peinada de rack,peinada de tableros electricos, terminacion d salida de voz y datos.

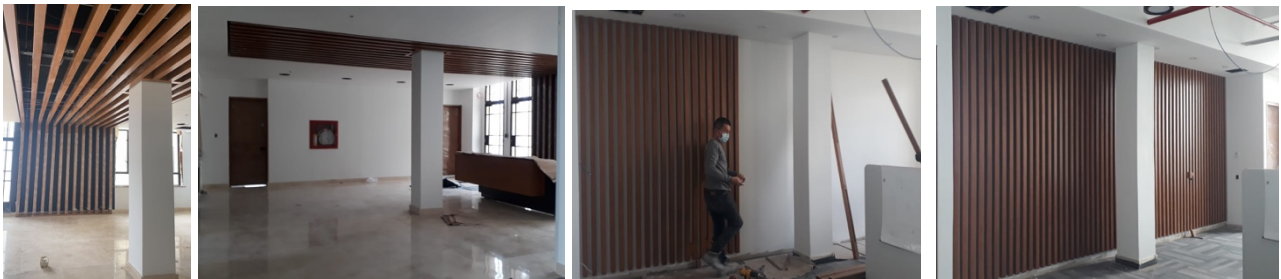

Suministro e instalaciónde celosías en madera: Se realizo el suministro e instalación de celosías verticales en madera ubicadas en la rececion de ascensores auxiliares y principales, oficinas



	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	27 de 34


Terraza tercer piso: Se realizó el mantenimiento de una zona correspondiente a la terraza del tercer piso debido a que presentaba filtraciones hacia el piso 2. Incluye: Desmonte la tableta existente y alistado, liastado nuevo, impereabilización, instalación de la tableta parecía a la original.



Retiro de residuos: Se realizó el retiro de residuos o desechos producto de la obra, se tuvo en cuenta la instalación de cartón para el cuidado del piso previa salida del material.




Señalización ascensores: Se realizó la instalación de las letras a cada ascensor.

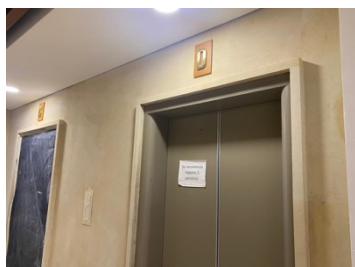


Guardaescobas : Se realizó la instalación de guardaescobas en madera en muros y columnas según especificaciones .

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	28 de 34





Mueble recepción: Se realizo la instalación del mueble de recepción con sus letras en bronce cumpliendo las especificaciones contractuales.

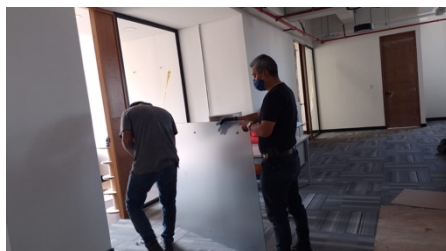

Tablero: Se realizo la instalación de los tableros en vidrio en oficinas y salas de juntas.



Puestos de trabajo: Se realizode puestos de trabajos completos en el segundo piso según diseño.

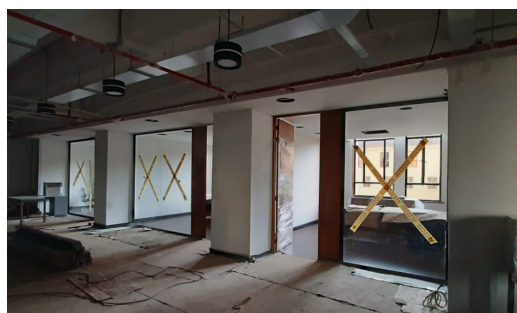


Divisones en vidrio: Se realizo la instalación de las divisiones en vidrios en oficinas.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	29 de 34



Baños privados: Vista de los baños privados de las oficinas de directores y subdirectores terminados.


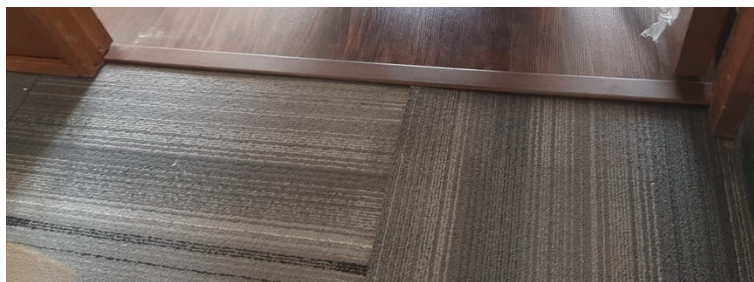


Pirlan: Se realizo la instalación de pirlanes en laminado en las purtas donde se unen alfombra y laminado.




Mobiliario: Se realizo la armada e instalación de mobiliarios como mueble para TV, archivadores, muebles para aoficinas privadas.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	30 de 34

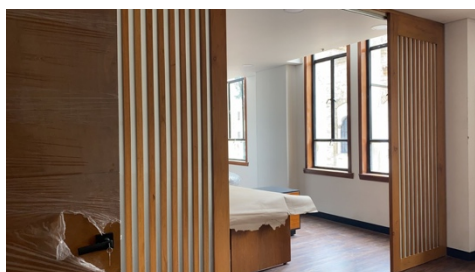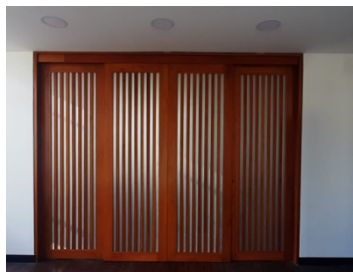

Puertas corredizas: Se realizó la instalación de las puertas corredizas en madera de oficinas y sala de juntas cumpliendo con las especificaciones contractuales

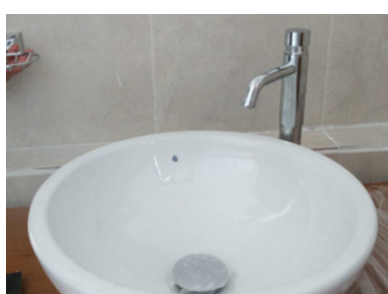


Grifería antibandálica : Se realizó la instalación de la grifería antibandálica en lavamanos de baños privados según especificaciones descritas en el contrato.




Tapas de inspección : Se realizó la construcción de tapas de inspección en cielo raso en drywall para realizar mantenimientos cuando se requiera.


	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	31 de 34

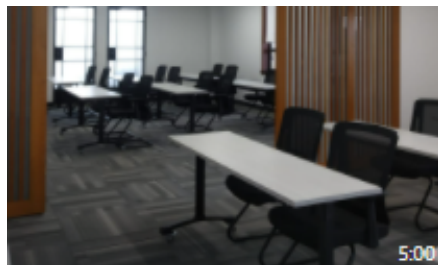

Sillas interlocutoras: Se realizó el suministro de las sillas interlocutoras para oficinas y salas de audiencias.



Puestos de trabajos: Se realizó el suministro e instalación de puestos de trabajo de 6, 2 y 1 puestos.

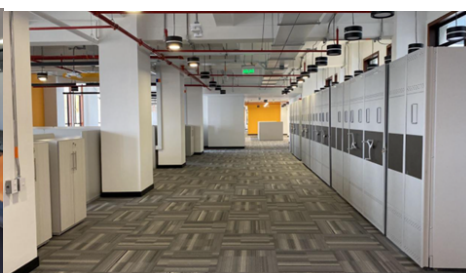

Aseo limpieza: Se realizó aseo y limpieza general de la obra.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	32 de 34



Señalización: Instalacion de señalización en cada uno de los lugares que fueron requeridos por la entidad



Pesaje de cables : Se realizo el pesaje del cable par telefónico, multipar telefónico,UTP, coaxial, VGA. Fibra óptica, entre otros.



Aplicación de producto para la limpieza de la piedra en mármol instalada en la zona de hall ascensores principal

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	33 de 34



Suministro e instalación de película frosted para divisiones de oficina (según diseño)



Instalacion de meson para apoyo zona cafetería según especificaciones



Restauracion de marcos en madera de ventanas existentes. Incluye alfajía, marcos, dintel, costados laterales,remoción de esmalte y acabado natural

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	34 de 34



Suministro e instalación de marcos en aluminio de color madera en con vidrio templado transparente



Suministro e instalación tablero para oficinas de directores

Carolina Ortiz Pineda

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Factura electrónica de venta N°: FE-15



ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO

73.096.526-1
Transversal 43 C # 102- 153 torre 2 apto 119 Conjunto Residencial Sorrento
Barranquilla - Colombia
3012703825
arqzm@gmail.com

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nit: 899.999.090-2

Teléfono: (601) 3811700

Dirección: Carrera 8 N° 6 C 38

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 18/03/2022, 19:42
Expedición 18/03/2022, 19:44
Vencimiento 18/03/2022
Vendedor Rafael Zamora
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Corte de obra N° 6 ENERO 2022 NOTA: Porcentaje de ejecución del contratista es del 90 % correspondiente al periodo del 01-01-2022 al 31-01-2022	1.00	37,000,287.08	44,030,341.63

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y cuatro millones treinta mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 44,030,341.63

Observaciones:

Total Bruto 37,000,287.08
IVA 19% 7,030,054.55
Total a Pagar 44,030,341.63

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026780805 aprobado en 20220318 prefijo FE desde el número 15 al 10000**
Vigencia: 6 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUFE

4698e6abb30da8ced66a99066999dc8569c3d7dc243c2277c2ce36f2742ba55225c1a369b271302d9bd8f749254ab77e



Elaborado por

Firma recibido

ANEXO 1. INFORMACION REQUERIDA PARA DEPURAR LA BASE GRAVABLE DE LA RETENCION EN LA FUENTE

Nombre: **RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO** CONTRATO No: **4.002-2021**
Cédula de Ciudadanía No. **73.096.526** DV **1**

Manifiesto que para el desarrollo de mi actividad, he contratado o vinculado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dentro del mismo periodo gravable, a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad. Art 1.2.1.20.2 Decreto 2250 del 29/12/2017.

Trabajadores a Cargo

☒ SI ☐ NO

Declarante

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.

☒ SI ☐ NO

DECLARACIÓN JURAMENTADA DEDUCCIONES

1. Certificación por concepto salud. Art. 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art. 9 Decreto 2250 de 2017 y Art 387 del E.T

Anexo Certificación

☐ SI ☒ NO

2. Certificación por concepto de Intereses o Corrección Monetaria en Créditos de Vivienda. Art. 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art. 9 Decreto 2250 de 2017 y Art 387 E.T.

Anexo Certificación

☐ SI ☒ NO

3. Información de Dependientes de acuerdo con el Artículo 1.2.4.1.18 del decreto 1625 de 2016 modificado por el Art. 9 Decreto 2250 de 2017 y Parágrafo 2 Art. 387 del E.T. Marcar la(s) opción(es) que le corresponde(n)

3.1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta dieciocho (18) años de edad.

☐

3.2. Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

☐

3.3. Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

☐

3.4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

☐

3.5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.

☐

Se firma el día 22 del mes de marzo del año 2022



**MINHACIENDA****DECLARACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**

Código :	Apo.3. Pro.3.Fr5
Fecha :	07/01/2020
Versión :	3

Yo RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO con Cédula de Ciudadanía número 73096526 con domicilio principal en la ciudad de BARRANQUILLA en cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, Art. 26 de la ley 1393 de 2010, los Artículos 108 y 126-1 del ET, Art. 3 Decreto 1070 de 2013 modificado por el Art. 9 del Decreto 3032 de 2013 y el Artículo 15 del Decreto 836 de 1991, declaro que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato 4.002-2021 suscrito con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador en la que se evidencia su estado pagada.

	NOMBRE DE EPS, AFP Y ARL	PLANILLA NÚMERO	PERIODO	VALOR APORTE (Sin Intereses de mora)
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ENERO - 9432385545	2022 - ENE	1.850.100,00
AFP	PORVENIR		2022 - ENE	2.516.300,00
ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		2022 - ENE	77.300,00

La totalidad de mi ingreso base de cotización por el respectivo Período, Si excede el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se firma el día 22 del mes de marzo del año 2022 con destino a la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Firma Rafael Eduardo Zamora Melo

Dirección : Transversal 43 C #102-153, Torre 2, apto 119
Teléfono : 3012703825
Email personal: arqrm@gmail.com
Email Institucional: locativashacienda@gmail.com
Ciudad y Depto. Res.: BARRANQUILLA(ATLANTICO)

Rentas No Laborales

Responsable de IVA -Declarante

Documento Recepción

Gestionado ➡ Recibidos



factura.electro... 24 mar.
para mí, arqrmz



Bogotá, 3/24/2022 2:25:42 AM

**Reciba un saludo cordial ZAMORA MELO
RAFAEL EDUARD:**

MINISTERIO DE
Factura FE15.

ha Aprobado la

Nota: La info
electrónico es
destinatario. Su

le este correo
camente a su
prohibido.

MINIST

UBLICO

3811700



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

**Si presenta inconvenientes por favor
comuníquese con el supervisor aprobador**

[illegible]


ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA.
DIRECTOR DE OBRA
UT NM-PROHACER.

[Firma]


ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA
DIRECTORA INTERVEN TURIA
RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

[illegible]

[illegible]

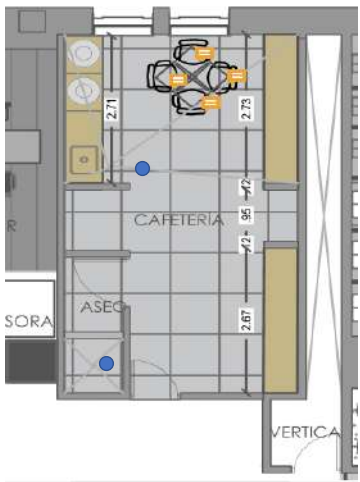MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
						CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER						
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES			
CAPITULO: N-7	UNIDAD	ENCHAPES		Suministro e instalación rejilla 3"x2" con sosco cromada mate o aluminio.					31-ene-22			
ITEM N -7.2		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6										
	M2	PERIODO DE CORTE		FICHA 1 DE 1					ESC.SIN ESCALA			
  				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD		
				COCINA NORTE			2,00			1,00	2,000	
				OBSERVACIONES:								
				SUB TOTAL					2,00	M2		
				ACUMULADO					2,00	M2		
				TOTAL					2,00			
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.				VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO								
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA Cargo: DIRECTOR DE OBRA				 Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

[illegible]

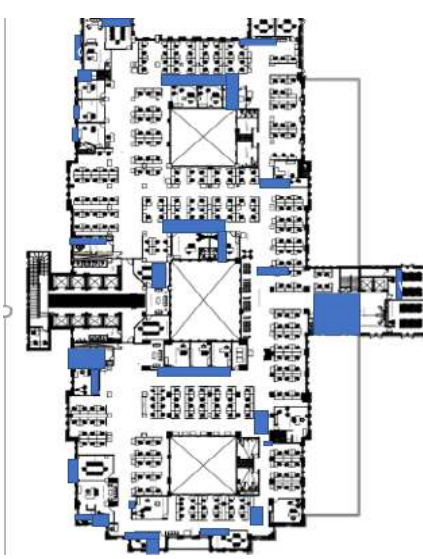MINHACIENDA		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA						CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER		GOBIERNO DE COLOMBIA										
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c.proiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.																				
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021				TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES										
CAPITULO:N-9		DRYWALL				Suministro e instalacion de cielo raso en drywall						31-ene-22								
ITEM N -9,1		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6																
		M2		PERIODO DE CORTE				FICHA 1 DE 3						ESC.SIN ESCALA						
					COSTADO		PISO 2		DIMENSIONES				TOTAL		OBSERVACIONES					
							ISLA		REFERENCIA		DM1		DM2		DM3		UNIDAD			

[illegible]

[illegible]

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA													
						CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER							
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.													
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES				
CAPITULO: N-9		DRYWALL			Suministro e instalacion de cielo raso resistente al agua para banos y cafeterias (incluye tapas inspeccionables).				31-ene-22				
ITEM N -9,4		UNIDAD			FICHA 1 DE 1				ESC.SIN ESCALA				
		M2											
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES	
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD			
				OF. NORTE W			2,49	1,85		1,000	5,607		
				FRENTE COCINA NORTE			1,70	2,20		1,000	4,740		
				SUR W			3,81	2,96		2,000	13,281		
				SUB TOTAL								23,63	M2
				ACUMULADO								23,63	M2
TOTAL								23,63					

OBSERVACIONES:

Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.

VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA

Nombre: ING. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA


Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
					CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER							
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES			
CAPITULO: N-10		DIVISIONES DE VIDRIO			Suministro e instalaci3n de divisi3n de oficina en aluminio color negro de 1 1/2 x 1 1/2 con vidrio con 8mm templado incoloro					31-ene-22		
ITEM N -10,1		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6			FICHA 1 DE 1			ESC.SIN ESCALA		
		M2		PERIODO DE CORTE								
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD		
  					NORTE		3,60	2,65		1,000	10,540	
							0,42	2,65		1,000	2,10660	
					SUB TOTAL					12,64660	M2	
					ACUMULADO					12,64660	M2	
					TOTAL						12,65	
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.				VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO								
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLO				Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA								
Cargo: DIRECTOR DE OBRA				Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA											
				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER									
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c.propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.													
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021			CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES			
CAPITULO:N-11		CARPINTERIA EN MADERA			Suministro e instalación de puerta cold rolled cal.18 con sus respectivos marcos (para zona de rack y verticales). Incluye cerradura, manija, bisagras, anticorrosivo y pintura en polvo al horno.					31-ene-22			
ITEM N -11,4		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6			FICHA 1 DE 1			ESC.SIN ESCALA			
		UND		PERIODO DE CORTE									
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES	
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD			
													
				PUERTA SALIDA A PISO 3 RECEPCION OCCIDENTAL							1,000	1,000	
											0,00		
											0,00		
				OBSERVACIONES:				SUB TOTAL					
ACUMULADO								1,00	UND				
TOTAL									1,00				
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.				VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO									
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA				Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA									
Cargo: DIRECTOR DE OBRA				Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA									


[illegible]

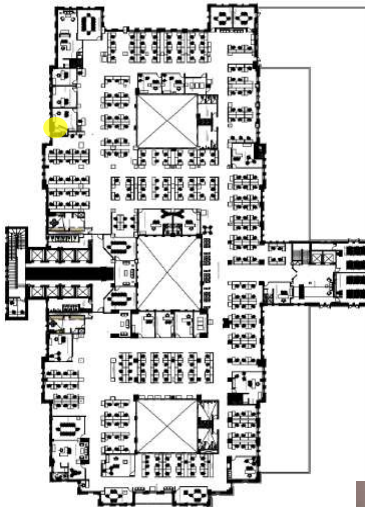MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER								
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021		TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES				
CAPITULO:N-12		CARPINTERIA EN MADERA		Reemplazo de marcos en madera vanos ventanas incluye alfajia, dintel y costados laterales, remoción esmalte y pintura acabado natural 2,45 m x 1,00 m				31-ene-22				
ITEM N -12,1		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6		FICHA 1 DE 1		ESC.SIN ESCALA				
		UND		PERIODO DE CORTE								
				PISO 2		DIMENSIONES			TOTAL	OBSERVACIONES		
				ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3			UNIDAD	
				SUR				1	1,00	1,00		
								SUB TOTAL			1,00	UND
				ACUMULADO			1,00	UND				
				TOTAL				1,00				
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.					V°B° Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO							
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLO Cargo: DIRECTOR DE OBRA					Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA							

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER												
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCPCM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCPL9-01-2021								
CAPITULO:N-12		CARPINTERIA EN MADERA		TIEMPO DE EJECUCION:								
ITEM N -12,6		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6		5 MESES								
UNIDAD		PERIODO DE CORTE		Restauración de marcos en madera vanos ventanas incluye alfajía, dintel y costados laterales, remoción esmalte y pintura acabado natural 2,45 m x 1,50 m								
UND				FICHA 1 DE 1								
		COSTADO		PISO 2	DIMENSIONES				TOTAL	OBSERVACIONES		
				ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD			
				NORTE					1	19,00	19,00	
											0,00	
											0,00	
OBSERVACIONES:												
				SUB TOTAL				19,00	UND			
				ACUMULADO				19,00	UND			
				TOTAL					19,00			
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.						VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO						
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA						Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA						
Cargo: DIRECTOR DE OBRA						Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA						

[illegible]

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																				
								CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER												
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c.,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.																				
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO			CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021			CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES									
CAPITULO:N-12		CARPINTERIA EN MADERA					Suministro e instalación muebles superior en madera					31-ene-22								
ITEM N -12,16		UNIDAD	ACTA PARCIAL DE OBRA N 6																	
		ML	PERIODO DE CORTE				FICHA 1 DE 1					ESC.SIN ESCALA								
						COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES						
							ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD								
						Descuento por mayor valor pagado acta 5														
						OBSERVACIONES:														

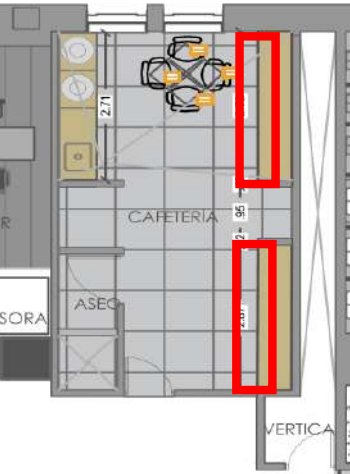MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA															
															
CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER															
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.															
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES						
CAPITULO: N-12	CARPINTERIA EN MADERA			Suministro e instalación de mesón de apoyo para cafetería en tablex y enchapado en fórmica.					31-ene-22						
ITEM N -12,18	UNIDAD	ACTA PARCIAL DE OBRA N 6													
	UND	PERIODO DE CORTE		FICHA 1 DE 1					ESC.SIN ESCALA						
 				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES			
					ISLA	REFEERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD					
				COCINA NORTE									2,73	2,71	
													2,7	2,65	
								SUB TOTAL					5,36	UND	
								ACUMULADO					5,36	UND	
				TOTAL					5,36						

OBSERVACIONES:

Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.

VºBº Interventoría: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA.

Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA.

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

[illegible]

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																
 MINHACIENDA				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER														
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.																		
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO			CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021			CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES							
CAPITULO:N-12			CARPINTERIA EN MADERA			Suministro e Instalación cenefa perimetral madera h=12cm espesor 25mm						31-ene-22						
ITEM N -12,20			UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6							ESC.SIN ESCALA						
			UND		PERIODO DE CORTE													
						FICHA 1 DE 1												
					COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES						TOTAL	OBSERVACIONES				
						ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD							
					Descuento por mayor valor pagado acta 5											-46,0	-46,00	
																	0,00	
																	0,00	

		 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER													
		OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.													
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021			CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES					
CAPITULO:N-13		MOBILIARIO PARA OFICINA			Sofá de dos y tres puestos					31-ene-22					
ITEM N -13,16		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6													
UNIDAD		PERIODO DE CORTE			FICHA 1 DE 1					ESC.SIN ESCALA					
UND															
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES			
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD					
				Descuento por mayor valor pagado acta 5									-13,0	-13,00	
									SUB TOTAL					-13,00	UND
									ACUMULADO					-13,00	UND
					TOTAL						-13,00				

Contratista: UNIDAD TEMPORAL NM - PROHACER.

Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINK

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO


Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA



[illegible]


[illegible]

[illegible]

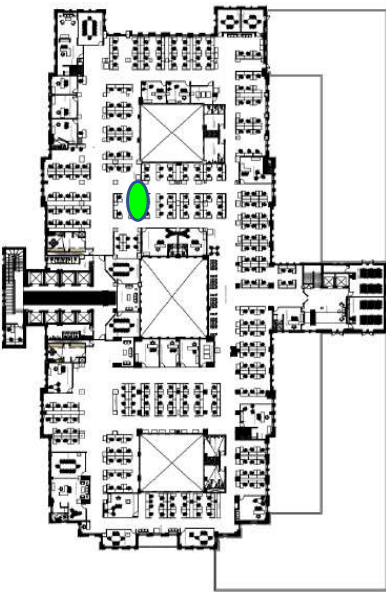		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA											
				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER									
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.													
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES				
CAPITULO:N-13		MOBILIARIO PARA OFICINA			Suministro e instalaci3n de Locker's con estructura en 3ngulo met3lico y cajas en MDF con acabado en chapilla. (0,80X0,35X0,30)				31-ene-22				
ITEM N -13,28		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6					ESC.SIN ESCALA				
		UND		PERIODO DE CORTE									
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES	
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD			
				SUR						-6	-6,00		
				DESCUENTO MAYOR VALOR PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA N 5									
OBSERVACIONES:													
				SUB TOTAL			-6,00	UND					
				ACUMULADO			-6,00	UND					
				TOTAL			-6,00	-6,00					
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.				VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO									
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA				Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA									
Cargo: DIRECTOR DE OBRA				Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA									

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER						
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES			
CAPITULO:N-14		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		Red suministro A.P. PVC P 1 1/4" Incluye anclaje tipo pera						31-ene-22		
ITEM N -14.1		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6		FICHA 1 DE 2				ESC SIN ESCALA		
ML		PERIODO DE CORTE										
				COSTADO		DIMENSIONES					OBSERVACIONES	
				ISLA		ITEM	DM1	DM2	TOTAL	TOTAL		
				SUR		COCINA-BAÑO	4,5	4,38		4,38	4,38	
				NORTE		BAÑO	7	13,4		13,40	13,40	
				NORTE		COCINA	2,3	39,3		39,30	39,30	
				NORTE		COCINA-BAÑO	2,8	30,22		30,22	30,22	
				SUR		COCINA	3	27,21		27,21	27,21	
OBSERVACIONES: ESTA CANTIDAD CORRESPONDE A SUMINISTRO PARA PISO 3, QUE SU RECORRIDOS POR PLACA SUPERIOR DE PISO 2.												
				SUB TOTAL				114,51	NL			
				ACUMULADO					NL			
				TOTAL				114,51				
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.				VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO								
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINIL				Cargos: DIRECTOR DE OBRA								
Cargos: DIRECTOR DE OBRA				Cargos: DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

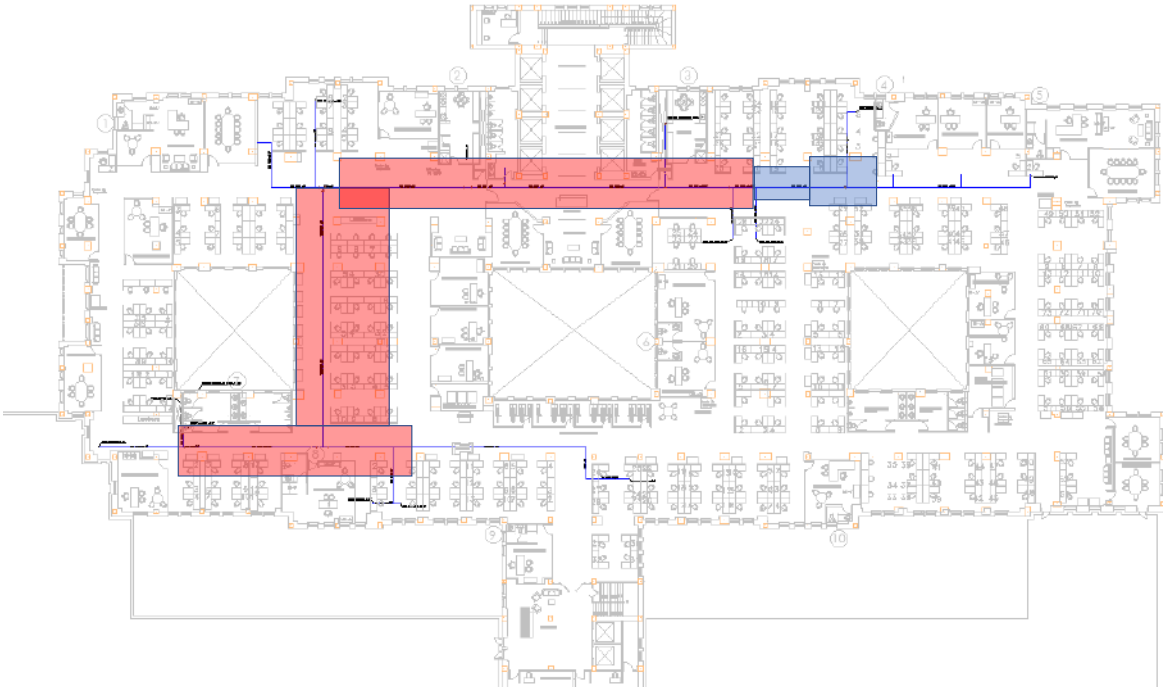MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA				
		 		
		CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER		
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.				
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021
CAPITULO: N-14		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		TIEMPO DE EJECUCION: 5 MESES
ITEM N -14.1		UNIDAD		Red suministro A.P. PVC P 1 1/4" Incluye anclaje tipo pera
		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6		31-ene-22
		PERIODO DE CORTE		FICHA 2 DE 2
				ESC. SIN ESCALA
				
OBSERVACIONES:			SUB TOTAL	
			114,51	
			ML	
			ACUMULADO	
			ML	
			TOTAL	
			114,51	
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.			VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO	
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA 				
Cargo: DIRECTOR DE OBRA			Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

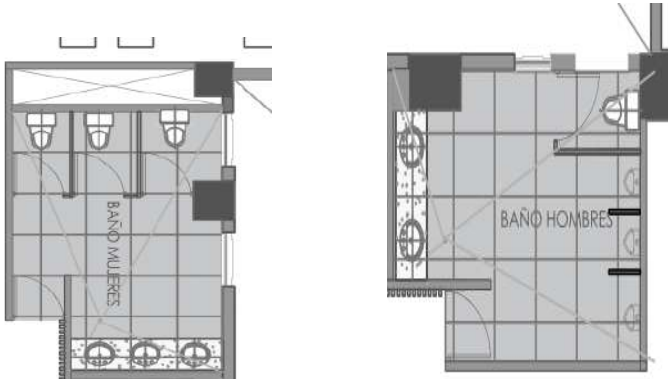MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA														
														
		CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER												
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.														
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021		TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES						
CAPITULO: N-15		ACCESORIOS		Suministro e instalacion kit valvula de carga alta presion 1 1/4 para sanitario y 1/2 para orinal, juego de accesorios conexión por encima botón de accionamiento tipo push		31-ene-22								
ITEM N -15,3		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6										
		UND		PERIODO DE CORTE				ESC. SIN ESCALA						
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES				TOTAL	OBSERVACIONES			
						REFERENCIA	DM1	DM2	DM3			UNIDAD		
				Descuento por mayor valor pagado acta 5					-1			4	-4,00	
								SUB TOTAL				-4,00	UND	
								ACUMULADO				-4,00	UND	
				TOTAL				-4,00						

OBSERVACIONES:

Contratista: UNIOA TEMPORAL NM - PROHACER.


VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA

Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

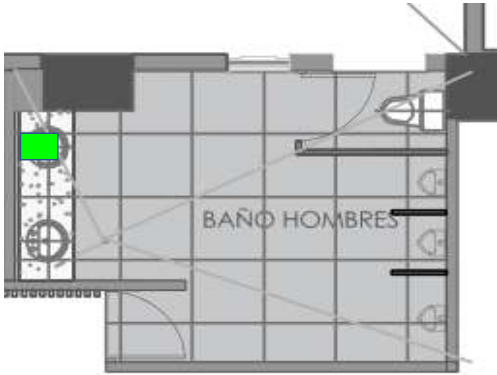MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										
										
CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER										
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.										
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021		TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES		
CAPITULO: N-16		VIDRIOS Y ESPEJOS				Suministro e instalaci3n de espejo en cristal dilatado del muro mediante perfiles en aluminio 5 mm				
ITEM N -16,1		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6				31-ene-22				
UNIDAD		PERIODO DE CORTE				ESC.SIN ESCALA				
M2										
 		COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES				TOTAL	OBSERVACIONES	
				REFERENCIA	DM1	DM2	DM3			UNIDAD
		Area faltante ba1o hombres			0,50	1,00		1	0,50	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
		SUB TOTAL							0,50	M2
ACUMULADO							0,50	M2		
TOTAL							0,50			

OBSERVACIONES:

Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.

VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA

Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA

Cargo: DIRECTOR DE OBRA

Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA


[illegible]







Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										
						CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER				
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c. propiedad de la nacion- ministerio de hacienda y credito.										
INTERVENTORIA: RAFAEL ZAMORA		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES	
CAPITULO: N-18		Instalaciones eléctricas			Suministro e instalación Tomacorriente eléctrica con polo a Tierra normal 110V					
ITEM N - 18.6		UNIDAD			31-ene-22					
		UND			ESC 1.1					
		PERIODO DE CORTE			FICHA 1 DE 1					
		UBICACIÓN		PISO 2				TOTAL	OBSERVACIONES	
				DIMENSIONES						
		ZONA		CIRCUITO	CANTIDAD	COLOR	PLANO	UNIDAD		
		NORTE		ORIENTE	2			UN	2	
		NORTE		TERRAZA	8			UN	8	
		NORTE		OCCIDENTE	1			UN	1	
		SUR		ORIENTE	2			UN	2	
		SUR		OCCIDENTE	1			UN	1	
NORTE		RACK	2			UN	2			
SUR		RACK	2			UN	2			
										
OBSERVACIONES: HOJA 1 DE 1  		SUB TOTAL								
		ACUMULADO								
		TOTAL								
						18	UND			
						18	UND			
						18	UND			
Contratista: UNION TEMPORAL NM-PROHACER.					V"B° Interventoria: RAFAEL ZAMORA					
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA 										
Cargo: DIRECTOR DE OBRA					Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA					




[illegible]

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA											
											
CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c. propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.											
INTERVENTORIA: RAFAEL ZAMORA		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES		
CAPITULO: N-19		DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED ELECTRICA			Cables de datos: Par telefonico, multipar telefonico, UTP, coaxial, fibra optica, VGA, entre otros				31-ene-22		
ITEM N -19.2		UNIDAD ACTA PARCIAL DE OBRA N 6			FICHA 1 DE 1				ESC 1.1		
KG		PERIODO DE CORTE									
 		MATERIAL ENTREGADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES	
			No. DE SERIAL	CANTIDAD	DM1	DM2	DM3	UNIDAD			
			CABLE UTP 1E	8,2				KG			8,20
			CABLE UTP 2E	8,25				KG			8,25
			CABLE UTP 3E	7,75				KG			7,75
			CABLE UTP 4E	7,25				KG			7,25
			CABLE UTP 5E	16,85				KG			16,85
			CABLE UTP 6E	10,15				KG			10,15
			CABLE UTP 7E	14,65				KG			14,65
			CABLE UTP 8E	10,65				KG			10,65
			CABLE UTP 9E	13,4				KG			13,40
			CABLE UTP 10E	21,45				KG			21,45
			CABLE UTP 11E	9,35				KG			9,35
			CABLE UTP 12E	8,75				KG			8,75
			CABLE UTP 13E	7,15				KG			7,15
			CABLE UTP 14E	13,3				KG			13,30
CABLE UTP 15E	10				KG	10,00					
 											
OBSERVACIONES: HOJA 1 DE 1			SUB TOTAL					167,15	KG		
			ACUMULADO					167,15	KG		
			TOTAL					167,15			
Contratista: UNION TEMPORAL NM-PROHACER.			VºBº Interventoria: RAFAEL ZAMORA								
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILIA Cargo: DIRECTOR DE OBRA			 ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

				MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
		CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER					
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.							
INTERVENTORIA:RAFAEL ZAMORA		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021		TIEMPO DE EJECUCION:	
5 MESES							
CAPITULO:N-19		DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED ELECTRICA		Cable eléctrico en general totalizadores, breakers, tomas eléctricas		31-ene-22	
ITEM N -19.3		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6		ESC 1.1	
KG		PERIODO DE CORTE		FICHA 1 DE 1			
							
							

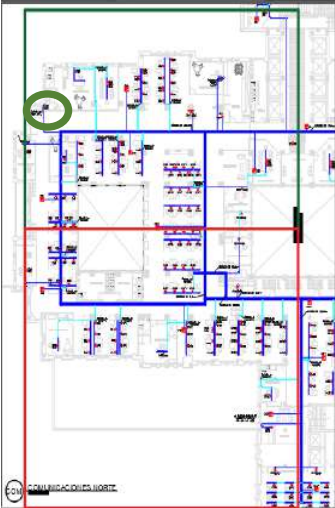MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
		 				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER						
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c, propiedad de la nacion- ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA: RAFAEL ZAMORA		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES			
CAPITULO: N-19		INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN AREAS DE TRABAJO			Puntos de red sencillos puesto de trabajo				31-ene-22			
ITEM N - 19.15		UNIDAD			FICHA 1 DE 1				ESC 1.1			
		UND										
		PERIODO DE CORTE										
		UBICACIÓN		PISO 2	DIMENSIONES				TOTAL	OBSERVACIONES		
				TABLERO	CIRCUITO	CANTIDAD	COLOR	PLANO	UNIDAD			
		COSTADO NORTE ORIENTAL				1			UN		1	
		OBSERVACIONES: HOJA 1 DE 1										
		SUB TOTAL									1 UND	
ACUMULADO									1 UND			
TOTAL									1			
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER		V°B° Interventoria: RAFAEL ZAMORA										
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA 												
Cargo: DIRECTOR DE OBRA		Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA										

                                                	
--	--

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
									
CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER									
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c. propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.									
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021		TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES	
CAPITULO: ASEO GENERAL		SEÑALIZACION		Producción suministro e instalación de sistema de señalización para dependencia y tráfico interior.				31-ene-22	
ITEM: 20.1		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6					
		GLOBAL		PERIODO DE CORTE		FICHA 1 DE 1			
						ESC. SIN ESCALA			
									
DIRECTORIO • DIRECCION DE APOYO FISCAL • DIRECCION GENERAL DE REGULACIÓN ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL • DIRECCION ADMINISTRATIVA • CONTRATACION DIRECTA • LICITACIONES Y PROCESOS ESPECIALES • SUBDIRECCION DE SERVICIOS • COMITÉ DE REGULA FISCAL		DIRECTORIO • DIRECCION ADMINISTRATIVA • CONTRATACION DIRECTA • LICITACIONES Y PROCESOS ESPECIALES • SUBDIRECCION DE SERVICIOS • COMITÉ DE REGULA FISCAL		SALA DE AUDIENCIAS SALA DE AUDIENCIAS		SALA DE AUDIENCIAS SALA DE AUDIENCIAS		SALA DE AUDIENCIAS SALA DE AUDIENCIAS	
A B C D E F		A B C D E F		A B C D E F		A B C D E F		A B C D E F	
SALA SALA CAFETERIA		SALA SALA CAFETERIA		SALA SALA CAFETERIA		SALA SALA CAFETERIA		SALA SALA CAFETERIA	
DIRECCION GENERAL APOYO FISCAL		DIRECCION GENERAL APOYO FISCAL		DIRECCION GENERAL APOYO FISCAL		DIRECCION GENERAL APOYO FISCAL		DIRECCION GENERAL APOYO FISCAL	
									
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NM - PROHACER		Y/B* Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA		Nombre: ARO. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA		Cargo: DIRECTOR DE OBRA	
Cargo: DIRECTOR DE OBRA		Cargo: DIRECTOR DE OBRA		Cargo: DIRECTOR DE OBRA		Cargo: DIRECTOR DE OBRA		Cargo: DIRECTOR DE OBRA	


		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA																				
				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER																		
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.																						
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO				CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021				CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021				TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES								
CAPITULO:ASEO GENERAL				ASEO GENERAL				Aseo general de obra						31-ene-22								
ITEM: 21.1				UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6		FICHA 1 DE 1						ESC.SIN ESCALA								
				M2		PERIODO DE CORTE																
								COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES						TOTAL	OBSERVACIONES					
									ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD								
OBSERVACIONES:																						
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.								V°B° Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO														
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA Cargo: DIRECTOR DE OBRA								Nombre: CAROLINA ORTIZ PIZARRA Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA														

[illegible]


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										
				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER						
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c.,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.										
INTERVENTORIA:RAFAEL ZAMORA		CONTRATO INTERVENTORIA:M MCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:M MCP-L9-01-2021		TIEMPO DE EJECUCION:				
CAPITULO: E-NP		NP OBRAS ELECTRICAS		Certificación RETILAP						
E-NP-03		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6				31-ene-22				
UNIDAD		PERIODO DE CORTE		FICHA 1 DE 1		ESC 1.1				
UND										
		UBICACIÓN		PISO 2	DIMENSIONES			TOTAL	OBSERVACIONES	
				CIRCUITO	CANTIDAD	COLOR	PLANO	UNIDAD		
		PISO 2			1			UN	1	
OBSERVACIONES: HOJA 1 DE 1										
				SUB TOTAL			1	UND		
				ACUMULADO			1	UND		
						TOTAL		1		
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.		VºBº Interventoria: RAFAEL ZAMORA ING. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA Cargo: DIRECTOR DE OBRA								
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA Cargo: DIRECTOR DE OBRA		Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA									
				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER					
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c.proiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.									
INTERVENTORIA:RAFAEL ZAMORA		CONTRATO INTERVENTORIA:M MCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:M MCP-L9-01-2021					
CAPITULO: E-NP		NP OBRAS ELECTRICAS		Suministro e instalaci3n de alimentador en calibre 3x4+1x4+1x6 Cobre (TN07 y TR07)					
E-NP-04	UNIDAD	ACTA PARCIAL DE OBRA N 6							
	ML	PERIODO DE CORTE		FICHA 1 DE 1					
	UBICACION	PISO 2	DIMENSIONES			TOTAL	OBSERVACIONES		
			CIRCUITO	CANTIDAD	COLOR	PLANO	UNIDAD		
	TABLEROS TN07 Y TR07			56			ML	56	
	OBSERVACIONES: HOJA 1 DE 1								
							SUB TOTAL	56	ML
						ACUMULADO	56	ML	
						TOTAL		56	
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.		VºBº Interventoria: RAFAEL ZAMORA							
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLO Cargo: DIRECTOR DE OBRA		CAROLINA ORTIZ PEDRAZA. Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA							

[illegible]

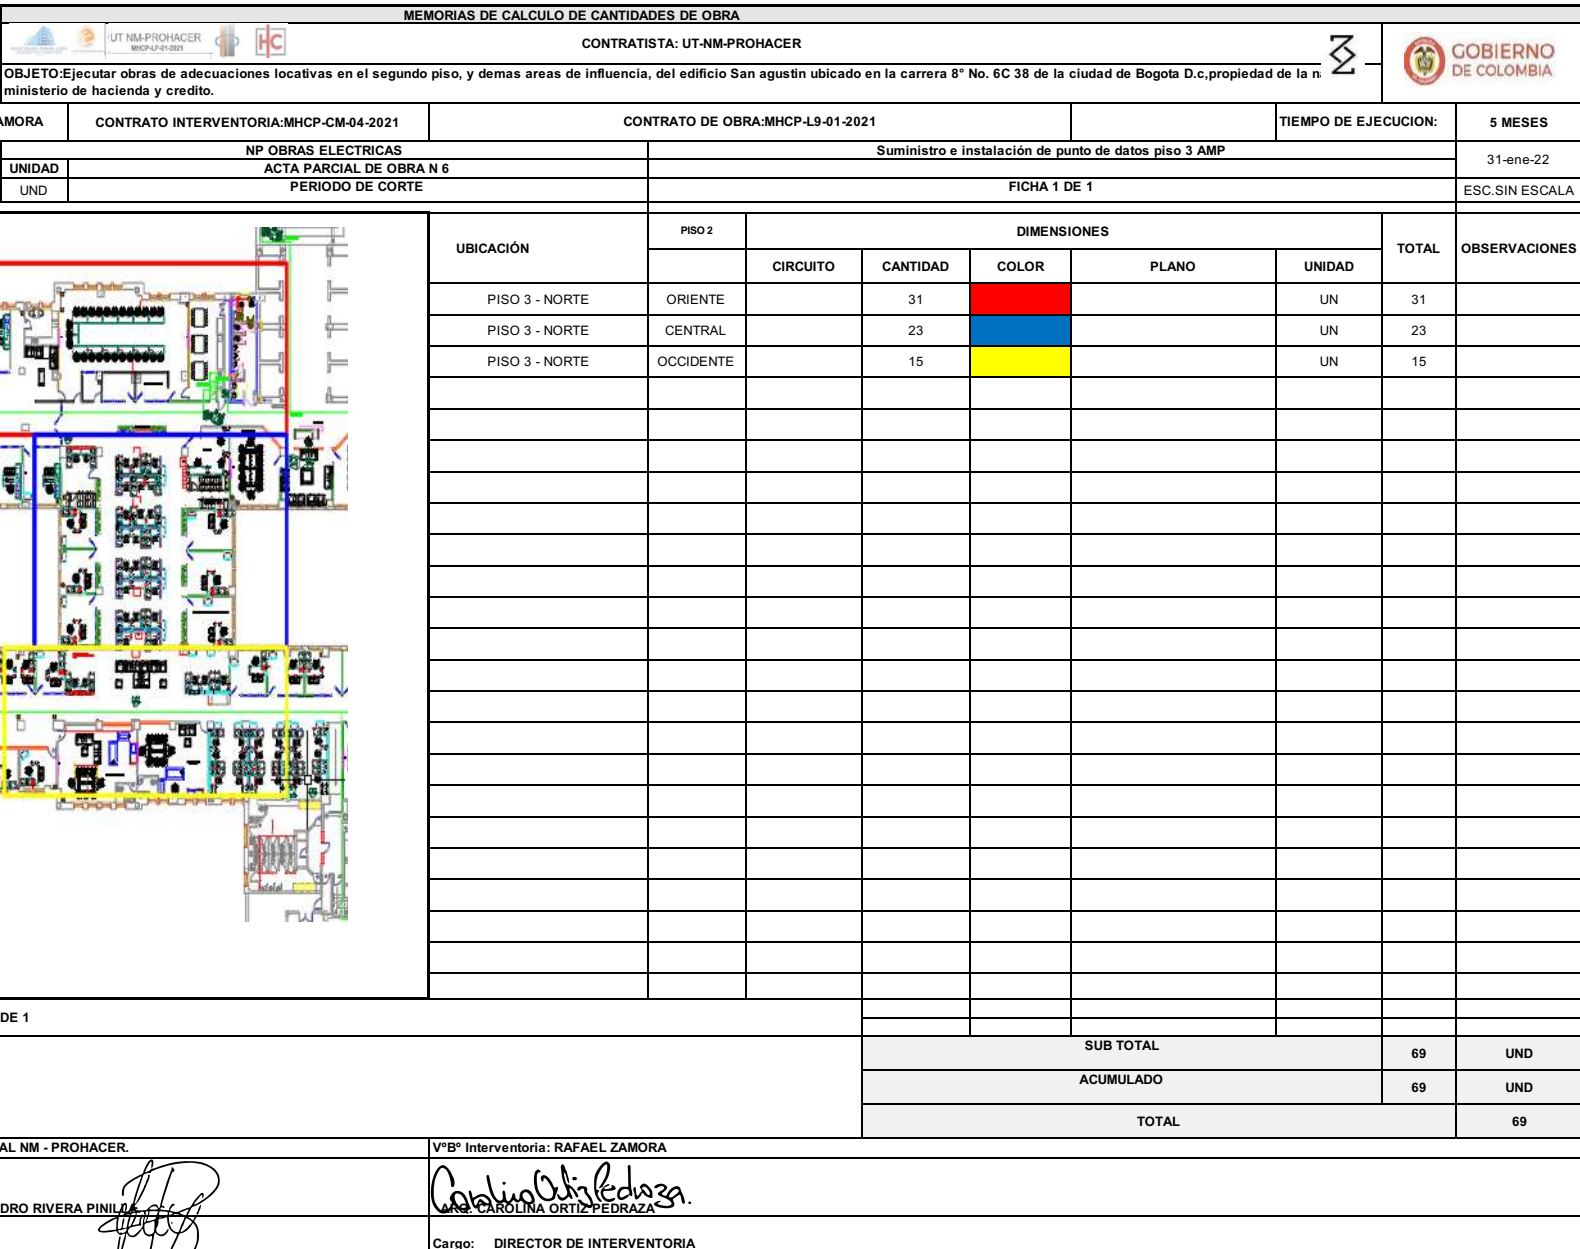

[illegible]

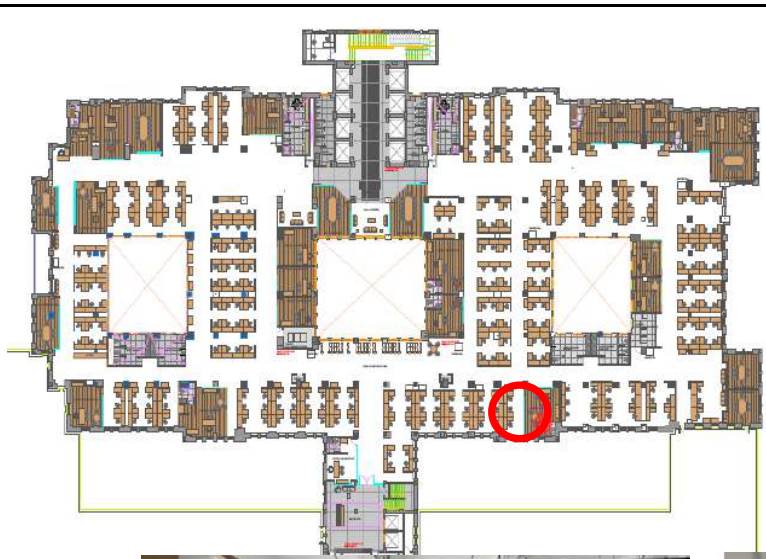		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
				CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER										
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.														
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES					
CAPITULO: M-E		MODIFICACIONES ESPECIALES MUEBLES			Isla de 6 puestos, cada puesto de 1,50 m x 1,50 m aproximado, superficie en aglomerado enchapado con fórmica, portateclado metálico diagonal a 45° desmontable, archivadores 2x1, rieles esferados para gavetas, herrajes, gabinete, parales, bases, montante de 45cm entre cada puesto para independencia en vidrio opalizado laminado 6mm, anclajes de acero a superficie, pasacables. troquelado para la instalación de puntos eléctricos y voz/datos. cada puesto de trabajo FICHA 1 DE 1				31-ene-22					
ITEM ME-6		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6										
		UND		PERIODO DE CORTE										
					PISO 2		DIMENSIONES				TOTAL	OBSERVACIONES		
					COSTADO	ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3			UNIDAD	
					AREA NORTE				1		1	1,00		
											1	0,00		
							SUB TOTAL				1,00	UND		
							ACUMULADO				1,00	UND		
							TOTAL					1,00		
OBSERVACIONES:					 									
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.					Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO									
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLOS					Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA									
Cargo: DIRECTOR DE OBRA					Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA									

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA														
						CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER								
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.														
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021		TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES						
CAPITULO: M-E		MODIFICACIONES ESPECIALES MUEBLES		Silla interlocutora en microfibra para oficina cerrada, base negra.				31-ene-22						
ITEM ME-7		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6				ESC.SIN ESCALA						
		UND		PERIODO DE CORTE				FICHA 1 DE 1						
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES		
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD				
				SALA AUDIENCIAS				5		1	5,00			
								SUB TOTAL					5,00	UND
								ACUMULADO					5,00	UND
				TOTAL					5,00					


OBSERVACIONES:


Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.
VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO

Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA
Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA

Cargo: DIRECTOR DE OBRA
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

		MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA										
		CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER										
OBJETO:Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c,propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA:RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA:MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA:MHCP-L9-01-2021				TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES		
CAPITULO:O.C. N.P.		ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL		Impermeabilización terraza (40 m2) incuye alistado y reposición de piso						31-ene-22		
ITEM N -OC-NP-1		UNIDAD		ACTA PARCIAL DE OBRA N 6				FICHA 1 DE 1		ESC.SIN ESCALA		
		M2		PERIODO DE CORTE								
				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES
					ISLA	REFEERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD		
				TERRAZA 3ER PISO		8	5		1	40,00		
 				 		SUB TOTAL		40,00		M2		
						ACUMULADO		40,00		M2		
						TOTAL		40,00		M2		
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER.				VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO								
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA Cargo: DIRECTOR DE OBRA				Nombre: ARQ. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

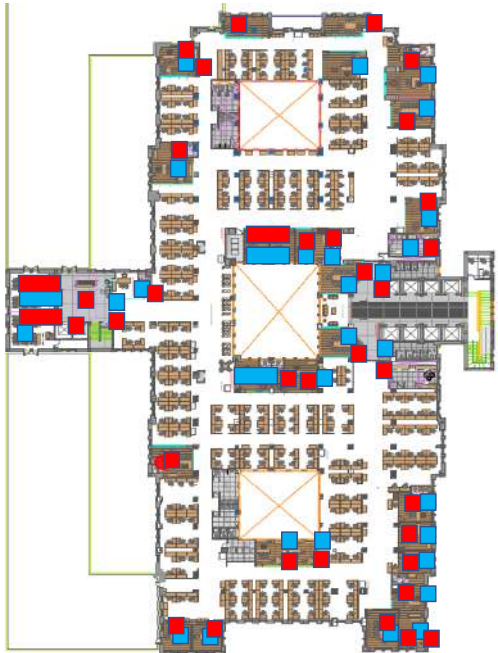MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA												
												
CONTRATISTA: UT-NM-PROHACER												
OBJETO: Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el segundo piso, y demas areas de influencia, del edificio San agustin ubicado en la carrera 8° No. 6C 38 de la ciudad de Bogota D.c. propiedad de la nacion-ministerio de hacienda y credito.												
INTERVENTORIA: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO		CONTRATO INTERVENTORIA: MHCP-CM-04-2021		CONTRATO DE OBRA: MHCP-L9-01-2021			TIEMPO DE EJECUCION:		5 MESES			
CAPITULO: O.C. N.P.		ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL			Camara de inspeccion en cieloraso de 60 x 60 incluye apertura de hueco, marco en aluminio y tapa en drywall							
ITEM N -OC-NP-2		UNIDAD			31-ene-22							
		UND			ESC. SIN ESCALA							
				FICHA 1 DE 1								
 				COSTADO	PISO 2	DIMENSIONES					TOTAL	OBSERVACIONES
					ISLA	REFERENCIA	DM1	DM2	DM3	UNIDAD		
				RCI	BAÑO	1	1			33	33,00	
				ELE	BAÑO	4	1			30	30,00	
OBSERVACIONES:												
				SUB TOTAL					63,00	UND		
				ACUMULADO					63,00	UND		
				TOTAL					63,00			
Contratista: UNION TEMPORAL NM - PROHACER				VºBº Interventoria: RAFAEL EDUARDO ZAMORA MELO								
Nombre: ING. JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA				Nombre: ARO. CAROLINA ORTIZ PEDRAZA								
Cargo: DIRECTOR DE OBRA				Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1373581728	9432385545	N	2022/02/07	2022/03/17	BANCOLOMBIA		\$4,153,40

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73096526		ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 43B #102 - 153 TORRE 2 Apto 119	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6642962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1373581728	9432385545	N	2022/02/07	2022/03/17	BANCOLOMBIA		\$4,153,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,356,300	\$0	\$2,356,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$2,356,300	\$0	\$2,356,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$72,000	\$0	\$72,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$72,000	\$0	\$72,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,725,100	\$0	\$1,725,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,725,100	\$0	\$1,725,100	
TOTAL				1	\$4,153,400	\$0	\$4,153,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73096526		ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 43B #102 - 153 TORRE 2 Apto 119	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6642962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1326192880	9430913742	I	2022/02/07	2022/02/14	BANCOLOMBIA		\$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	73096526	ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO							X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	0	\$0	\$0	No	\$290,300
Total Afiliados(1)																							\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$5,300		\$0	\$0		\$290,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73096526		ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 43B #102 - 153 TORRE 2 Apto 119	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6642962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1326192880	9430913742	I	2022/02/07	2022/02/14	BANCOLOMBIA		\$290,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$160,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$160,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$5,300		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,300	\$0	\$5,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$125,000		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$125,000	\$0	\$125,000		
TOTAL				1	\$290,300	\$0	\$290,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73096526		ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 43B #102 - 153 TORRE 2 Apto 119	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6642962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1326192880	9430913742	I	2022/02/07	2022/02/14	BANCOLOMBIA		\$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	73096526	ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO							X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	0	\$0	\$0	No	\$290,300		
Total Afiliados (1)																							\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$5,300			\$0	\$0			\$290,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73096526		ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 43B #102 - 153 TORRE 2 Apto 119	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6642962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1326192880	9430913742	I	2022/02/07	2022/02/14	BANCOLOMBIA		\$290,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$160,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$160,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$5,300		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,300	\$0	\$5,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$125,000		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$125,000	\$0	\$125,000		
TOTAL				1	\$290,300	\$0	\$290,300		
